公共施設の複合化

――「減らす」から「組み替える」へ

商業・文化・福祉・交通を「広場」でつなぐ――自治体とデベロッパーの実務

上村　章文

見本紙面（序章・第1章〜第3章・第17章）
A5判。本文は明朝、見出し・表・柱はゴシック。ページ番号は見本用の通し番号です。

序章

なぜ「減らす」から「組み替える」へなのか

ポイント

❶ 公共施設等総合管理計画は、全団体がつくった。**それでも施設の総量は、10年で1.3%増えた**。
❷ 人口が減り、建物が古くなり、担い手が減る。**三つの圧力は同時に来る**。
❸ この数年で、複合化を支える制度が相次いで作り替えられた。**最も有利な借入れの期限は、2026年度で切れる**。
❹ 複合化は、面積を減らす手段ではない。**地域に必要な機能を、人が集まり、運営しやすい形に組み替える手段である**。
❺ 本書は、自治体と商業施設のデベロッパーの**両方に向けて**書いた。同じ事例を、両側から読めるようにしてある。

0-1　計画はできたのに、減っていない

公共施設等総合管理計画は、全国のすべての自治体がつくった。全1,788団体、策定率は100%である（2025年3月末）。

ところが、市区町村が持つ公共施設の延床面積は、2023年度末で約4億8,683万㎡ある。10年前より1.3%増えた。

「減らす計画」だけでは、施設は減らない。これが本書の出発点である。

減らない理由は、担当者の努力不足ではない。施設を一つ減らす話は、その施設を使う人にとっては「失う話」でしかない。失う話だけを持って住民の前に立てば、合意は得られない。必要なのは、**減らす代わりに何を得るのか**を示すことである。

0-2　三つの圧力は、同時に来る

圧力	主なデータ	複合化への意味
人口が減る	2050年に人口が2020年より減る市区町村は1,651（95.5%）。うち約6割は30%以上減る	施設ごとの利用者が減り、単独では維持できない施設が増える
建物が古くなる	インフラ等の今後30年の維持更新費は、壊れてから直す方式で約280兆円、予防的に直す方式で約190兆円	建て替えの時期をそろえ、まとめて一つにすれば、更新費を圧縮できる
担い手が減る	市区町村の土木部門の職員は1996年比で27.1%減。技術系職員が0人の市区町村は約25%	施設が散らばるほど、管理の手間が増える。まとめれば少ない人数でも回せる

三つは別々の問題に見える。しかし、同じ方向を指している。**利用者も、お金も、人手も、施設の数に追いつかない。**

0-3　制度が、相次いで作り替えられた

もう一つの理由は、制度が動いたことである。複合化を支える仕組みは、この数年で次々に作り替えられた。

年	動いたこと	複合化への意味
2017年	都市公園法の改正で、Park-PFI（公募設置管理制度）ができた	収益施設の稼ぎで公共空間を支える型が生まれた（第9章、第12章）
2018年	文部科学省が、公民館の営利事業を全面禁止とはしない解釈を示した（12月21日の事務連絡）	公民館にカフェや居酒屋を入れる道が開いた（第7章）
2020年	都市再生特別措置法の改正で、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」の制度ができた	道路を広場に戻し、施設どうしをつなぐ手段が制度になった（第1章）
2023年	地域公共交通活性化再生法の改正（10月施行）	交通とまちづくりの「連携と協働」が基本方針に入った（第11章）
2026年	地域公共交通活性化再生法の再改正	学校・病院・福祉施設・商業施設の送迎を、地域交通の協力者に位置付けた（第11章）
2026年度	公共施設等適正管理推進事業債（集約化・複合化）の対象は、この年度までに工事着手した分	2027年度以降の扱いは、本書の執筆時点で未公表（第13章）

適正管理債は、事業費の90%を借りられ、返済額の50%を国が地方交付税で手当てする。複合化にとって最も有利な借入れである。その期限が、2026年度で切れる。

> **期限は、着手を急ぐ理由にはなる。しかし、住民との対話の順序を飛ばす理由にはならない。**合意形成には、10年単位の時間がかかる例もある（第15章）。

2020年前後に出た公共施設マネジメントの本は、ここに並べた前提の多くが古くなっている。

0-4 「減らす」から「組み替える」へ

複合化の価値は、面積が減ることだけではない。図書館と子育て支援、カフェ、働く場が同じ建物にあれば、それぞれの利用者が互いの施設に立ち寄る。**1たす1が、2より大きくなる。**

一方で、まとめ方を誤ると、「行きにくくなった」「中身が薄くなった」という不満が残る。同じ複合化でも、組み合わせ方で結果は正反対になる。

全国では、すでに学校の約39%（11,450校）が、ほかの公共施設と複合化・共用化している（2022年9月時点）。ただし、相手の多くは防災備蓄倉庫（7,475校）や放課後児童クラブ（6,870校）である。図書館（75校）や公民館（608校）との本格的な複合化は、まだ少ない。

伸びしろは大きい。そして、その伸びしろを埋めるのは「何と何を、どこで、どう束ねるか」という判断である。本書は、その判断のための本である。

0-5　本書の芯――外部経済効果を「広場」でつなぐ

本書を貫く考え方は一つである。

> **商業施設にも公共施設にも、まわりに人と便益を広げる力（外部経済効果）がある。自動車社会は、それを道路と駐車場で分断した。ヨーロッパの広場のように、役所・文化・商業を、もう一度一つの場に集める。**

第1章でこの考え方を説明し、第2章以降はすべて、その具体策として書いた。どの章の組み合わせも、「二つの効果が同じ場所で重なるか」という問いで判断する。

0-6　自治体とデベロッパーの、両方に向けて

主な読者は、市町村で公共施設の再編を担う課長・係長である。施設マネジメント、企画、財政、都市計画の各課を想定した。複合化は担当課をまたぐ。どの課から読んでも全体が分かるように書いた。

規模は、人口3万〜20万人の市町村を中心に置いた。大都市の成功例がそのまま使えない自治体が、いちばん困っているからである。

もう一つの読者は、**商業施設のデベロッパーと運営会社**である。複合化のうち商業との融合では、床を建て、テナントを集め、運営するのは民間である。自治体だけでは完結しない。

読者	この本でできるようになること
課長・係長	候補地ごとに「何と何を組み合わせるか」を決め、庁内と議会に説明できる
首長・幹部	「減らす」ではなく「組み替える」として方針を示せる
議員	再開発や複合化の提案が、失敗の型に当てはまらないかを確かめられる
デベロッパー・運営会社	公共を入れた商業施設の事業性を見積もり、自治体に通る提案を組める

自治体向けの本と民間向けの本は、ふつう別の棚に並ぶ。本書は、**同じ事例を両側の算盤で読む。**自治体の担当者にとっても、民間の算盤が分かれば、公募の条件を現実的に書ける。

0-7　本書の使い方

全章を同じ形で書いた。

- 冒頭に「この章の要点」を置いた。結論だけを5項目以内で示す。
- 本文の節番号（1-1など）は、紙の版とWebの版で同じである。
- 章の終わりに、人口規模別の「理想・次善・最低限」の表を置いた。**「できないから何もしない」を防ぐためである。**規模の区切り（20万人以上、5万〜20万人、5

万人未満）は、姉妹編『自治体の公民連携ハンドブック』とそろえた。

- 第2部と第3部の各章の終わりに、「デベロッパーから見ると」の欄を置いた。第5部は、その欄を束ねて深めた部である。

通読は想定していない。**困っていることから引いていただきたい。**

困っていること	最初に読む章
何と何を組み合わせればよいか分からない	第2章
駅前の再開発ビルが空いている	第3章
商業施設に図書館や窓口を入れたい	第5章、第17章
公民館や文化施設の利用が減っている	第6章、第7章
財源の当てがない	第13章
住民の反対が強い	第15章
自治体に複合化を提案したい（民間）	第17章〜第19章

0-8　本書が扱わないこと

- **施設の総量をどれだけ減らすか**という、量の議論は扱わない。どの施設を残し、束ね、転じ、畳むかの判定は、すでに各自治体の計画にある。本書は「束ねる」と決めたあとの話である。
- **手法（PFI、指定管理など）の選び方**は、姉妹編『自治体の公民連携ハンドブック』に譲る。あちらは「どの手法で発注するか」、本書は「何と何を組み合わせ、どんな場をつくるか」を扱う。
- **大都市の大型再開発**は、参考として触れるにとどめる。地価の高い場所だから成り立った手法は、そのままは真似できない。

0-9　この章で覚えておくこと

「施設を減らせ」と言われたら、**「減らして、何を得るのか」**を先に考える。
答えが「にぎわい」なら、第1章へ。答えが「まだない」なら、第2章へ。

第1部　考え方

第1章

外部経済効果を「広場」でつなぐ

ポイント

❶ **商業施設にも公共施設にも、外部経済効果がある。**使う人の外にまで、便益が広がる。
❷ 二つの効果は性格が違う。**公共は平日の昼に、商業は週末と夕方に人を呼ぶ。**だから組み合わせると強くなる。
❸ 自動車社会は、施設を道路と駐車場で切り離した。**効果は互いに届かなくなった。**
❹ 複合化は建物の中で完結させない。**建物の前に広場を置き、入口を広場に向ける。**
❺ **広場はつくるだけでは人が集まらない。**運営する人と予算を、建物と同時に用意する。

1-1　外部経済効果とは何か

施設を使う人だけでなく、まわりの人や店にも便益が広がる。この効果を**外部経済効果**という。

商店街で考える。店が集まっていると、客は一軒で用を済ませない。歩いて何軒も回る。ある店を目当てに来た客が、隣の店でも買い物をする。店が集まること自体が、それぞれの店の売上を押し上げる。これが商業の外部経済効果である。

公共施設にも同じ力がある。役所の窓口、図書館、病院、子育て支援センターは、毎日、決まって人を呼ぶ。その人たちが帰りに買い物をし、お茶を飲む。公共施設は料金ではほとんど稼がない。しかし、まわりの店から見れば、**毎日人を連れてきてくれる装置**である。

二つの効果は、性格が違う。

	商業施設の外部経済効果	公共施設の外部経済効果
人を呼ぶ理由	品ぞろえ、楽しさ、値段	手続、学び、子育て、医療など生活の必要
人の来かた	週末や夕方に波がある	平日の昼にも安定して来る
景気の影響	受けやすい	受けにくい
本人の稼ぎ	売上として回収する	料金ではほとんど回収しない

この違いがあるから、組み合わせると強くなる。公共施設は平日の昼に安定して人を呼び、商業施設は週末と夕方ににぎわいをつくる。互いの弱い時間帯を、相手が埋める。

複合化の価値は、面積が減ることより、二つの効果を同じ場所で重ねられることにある。

1-2　自動車社会が分断したもの

車で移動する社会では、施設ごとに駐車場を持つ。人は目的地だけに行って帰る。役所は郊外の広い敷地に移り、商業は幹線道路沿いの大型店に集まり、病院やホールはまた別の場所に建った。

施設どうしが道路と駐車場で切り離されると、それぞれの外部経済効果は互いに届かない。役所に来た人は、用事を済ませると車でまっすぐ帰る。帰りに寄るはずだった店は、遠すぎて寄れない。歩いて回る人がいなくなった中心部の商店街から、衰退が進んだ。


青森市では、郊外のバイパス沿いに店が集まり、中心部の路線価は再開発ビルの開業時の約3分の1まで下がったと報じられている（第3章）。

	自動車社会の配置	広場を中心にした配置
施設の場所	役所・病院・大型店がばらばらの場所にある	役所・文化施設・商業が広場を囲む
人の動き	車で目的地だけに行って帰る	歩いていくつもの施設を回る
外部経済効果	施設ごとに閉じ、まわりに届かない	広場で重なり、互いを高め合う
公共の空間	道路と駐車場	広場と歩行者の空間
商店街	衰退する	回遊する人の受け皿になる

ここで大事なのは、施設の一つひとつは悪くないということである。郊外の役所も、大型店も、それぞれの理屈で正しい場所を選んだ。問題は、全体として効果を打ち消し合う配置になったことである。

施設を一つずつ建て替える限り、この配置は直らない。複合化は、配置そのものを組み替える数少ない機会である。

図1-1　自動車社会の配置と、広場を中心にした配置

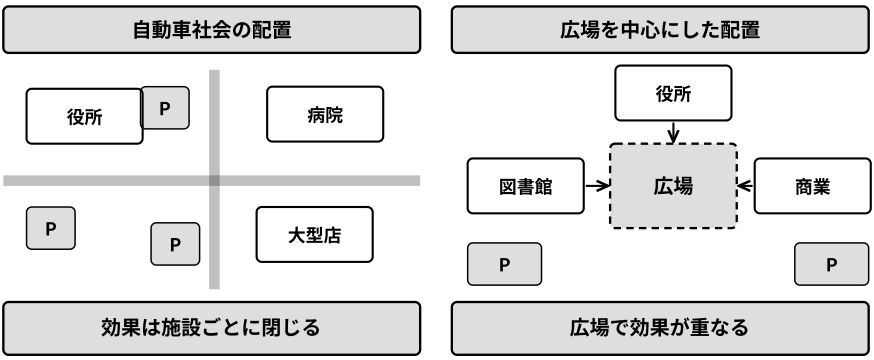

1-3　ヨーロッパの広場に学ぶ

ヨーロッパの都市では、中世から市庁舎・教会・市場が一つの広場を囲んできた。行政と祈りと商いが同じ場所に集まり、人の行き来そのものがまちの価値になっている。

- **シエナのカンポ広場（イタリア）**——市場や競技、行事の場として使われてきた。市庁舎のプッブリコ宮が面している。1349年に全体が舗装された。
- **ドイツの町のマルクト広場**——「市場の広場」という名のとおり、市庁舎と教会が面し、定期市が開かれる町の中心である。
- **コペンハーゲンのストロイエ（デンマーク）**——現代になって車を道路から外した例である。1962年に約1.1kmの通りを歩行者専用にした。歩行者の空間は約1.58万㎡から約10万㎡に広がった。

三つに共通するのは、**広場が「建物と建物のあいだの余り」ではなく、まちの主役として設計されている**ことである。施設の入口は広場に向き、人は広場を通って施設

に入る。広場に出ると、ほかの施設が目に入る。

ストロイエには、もう一つ教訓がある。車を外すとき、多くの商店主が「客が減る」と反対した。結果は逆だった。買い物客やカフェが増え、早くに成功した。**歩く人が増えると、商業の外部経済効果が回り始める。**日本の中心市街地で同じ議論をするとき、この経験は判断の材料になる。

1-4　日本での実践と国の制度

日本にも、広場で分断をつなぎ直した例がある。

- **富山市 グランドプラザ（2007年）**——再開発の区域内にあった路地のような市道をまとめ、両側の建物を後退させてつくった屋根付きの広場である。路面電車の停留所で降りた人が、広場を通って商業施設や商店街へ向かう流れが生まれた。**道路を広場に変えて、分断をつなぎ直した例**である。
- **紫波町 オガール（岩手県）**——図書館などの公共施設と商業の建物が、中央の広場を囲んで配置されている（第5章、第12章）。

国も制度を整えた。2020年9月施行の都市再生特別措置法の改正で、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」をつくる制度ができている。

制度	中身	複合化での使いどころ
まちなかウォーカブル推進事業	街路を広場に変える整備などを支援する	複合施設の前の道路を広場にする
民間の敷地を広場として開放したときの固定資産税の軽減	民間が自分の敷地を公共の広場として使わせる場合に税を軽くする	商業施設の前庭を、公共施設と共有の広場にする
歩行者利便増進道路（ほこみち）	道路を歩行者のために使う。公募で選ばれた者は最長20年の占用ができる	広場に面した道路にカフェや売店を出す

1-5　広場を中心に組む4つの原則


1. **複合化を建物の中だけで完結させない。**建物の前に広場を置き、公共施設・文化施設・商業の入口を広場に向ける。建物の中を通路でつなぐだけでは、外から人は入ってこない。

2. **公共施設を散らさない。**役所、図書館、ホールの建て替え先は、郊外の広い敷地ではなく、広場を囲む場所に選ぶ。建て替えの時期がずれていても、置く場所だけは先に決めておける。
3. **道路と駐車場で分断しない。**駐車場は外周にまとめ、広場のまわりは歩いて回れるようにする。必要なら道路の一部を広場に変える。
4. **広場の運営者と予算を先に決める。**マルシェやイベント、清掃を担う人（まちづくり会社や指定管理者）とその費用を、建物と同時に用意する。

4つめが、いちばん見落とされる。広場は、建物と違って、完成した日から自然に使われるものではない。

> **誰が、いつ、何のために使うのかを決めていない広場は、ただの空き地になる。**
> 建物の工事費と同じ表に、広場の運営費を書いておく。

図1-2　広場を囲む施設の配置（入口の向きと駐車場の位置）

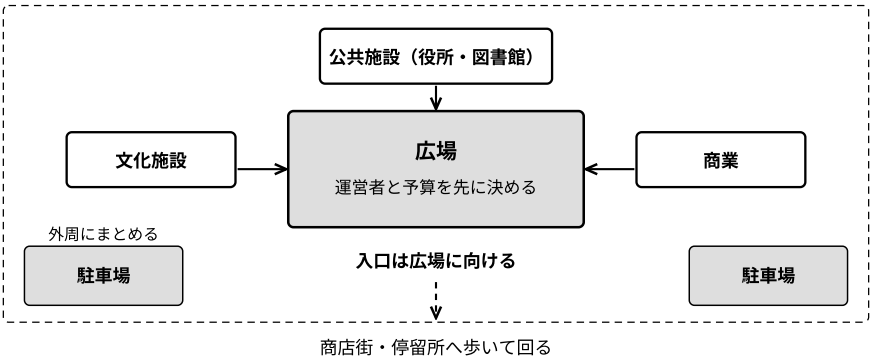

1-6　規模別の現実解――理想・次善・最低限

広場をつくれるのは、大きな都市だけではない。規模に応じて、できることがある。

	理想	次善	最低限
人口20万人以上	中心部の再編で、市庁舎・図書館・ホールと商業が広場を囲む配置にする。道路の一部を広場に変える	再開発や建て替えの区域内に、屋根付きの広場を一つ設ける	既存の公共施設の前庭を、イベントや出店に使えるよう規則を変える
人口5万〜20万人	学校や庁舎の建て替えに合わせ、公共施設と商業を一つの敷地にまとめ、中央に広場を置く	複合施設の入口側に広場を設け、駐車場を裏に回す	庁舎や図書館の駐車場の一角を、週末だけ広場として使う
人口5万人未満	支所・診療所・図書館・店を一か所にまとめた拠点の前に、小さな広場を置く	道の駅や商業施設の前の空間を、公共の催しにも使えるよう協定を結ぶ	公民館の前の空き地で、月1回の市（いち）を開く

「最低限」の欄は、予算がなくても今年度から始められる。広場の使い方を一度でも試すと、どこに人が来て、何が足りないかが分かる。大きな整備の前に、ここから始める。

1-7　デベロッパーから見ると

稼げるか。公共施設が平日の昼に人を呼べば、商業施設の弱い時間帯が埋まる。広場が施設の前にあれば、その人出が店の前を通る。

ただし、公共施設の来館者が実際にどれだけ買い回るかを示す公開データは、本書の執筆時点では見つけられていない【要確認】。**事業計画では、この効果を上振れの要素として扱い、確実な収入としては見込まない。**それが安全である。

どこにリスクがあるか。広場の運営費を誰が持つかが曖昧なまま始まると、清掃や警備の費用が商業側に寄ってくる。広場を共有するなら、運営者と費用の分担を協定に書く。

自治体に何を確かめるか。三つある。①広場の所有と管理の区分、②広場での出店やイベントの許可の手続、③駐車場の配置と台数の考え方（公共施設の利用者と商業の客で共用するか）である。

1-8　この章で覚えておくこと

複合化の図面を見せられたら、まず建物の外を見る。**入口がどこを向いているか、建物の前に誰でも入れる場所があるか。**それだけで、その計画が外部経済効果をつなごうとしているかどうかが分かる。

そして、広場の欄に運営費が書いてなければ、そこを最初に問う。

第2章

何と何を組み合わせるか（4つの類型）

ポイント

❶ 複合化は、組み合わせる相手で**4つの類型**に分けられる。公共×公共、公共×商業、公共×働く場、公共×住まい・医療福祉である。

❷ **相手が民間に近づくほど、にぎわいと民間資金を引き出せる。その分、商売が成り立たないときのリスクも大きくなる。**

❸ 類型は、四つの問いで選ぶ。利用時間帯は補い合うか、利用者は重なるか、民間が稼げる立地か、その場所に残すべき機能か。

❹ 多くの自治体にとって、出発点は**学校を核にした公共×公共**である。

❺ 商業や働く場は、市場性を確かめてから**小さな床で足す**。最初から大きく建てない。


2-1　4つの類型

類型	組み合わせの例	主に生まれる価値	主なリスク
A 公共×公共	学校＋公民館・図書館・放課後児童クラブ、庁舎＋保健センター	延床面積と管理費の圧縮、世代間の交流、窓口の一本化	学校の安全管理、所管課ごとの縦割り、機能が「等価」でないという不満
B 公共×商業・サービス	図書館＋産直・飲食・クリニック、庁舎の敷地にコンビニ、公園＋カフェ	来訪者の増加、賃料・借地料の収入、滞在時間の延長	テナントの撤退、商業の不振を公費で埋める事態
C 公共×働く場	庁舎の余った床にオフィス、廃校にサテライトオフィス、図書館にコワーキング	平日昼間の利用、起業や誘致の拠点、安定した賃料収入	都市部以外では入居の需要が読みにくい、民間の既存オフィスとの競合
D 公共×住まい・医療福祉	庁舎＋分譲マンション、公営住宅＋店舗、公民館＋デイサービス	余った容積（建てられるのに使っていない床）の売却で整備費を賄う、定住人口の確保	区分所有による将来の建て替えの難しさ、大都市以外での再現性

A から D へ進むほど、相手が民間に近づく。民間に近づくほど、にぎわいと民間の資金を引き出せる。

その代わり、商売が成り立たないときのリスクも大きくなる。B・C・D は、市場性（民間が稼げるかどうか）を確かめてから選ぶ。A は、市場性がなくても成り立つ。

図2-1　4つの類型――相手が民間に近づくほど、価値もリスクも大きくなる

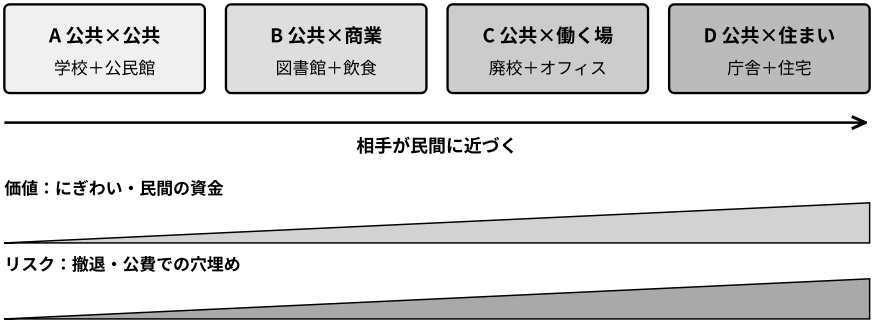

B・C・D は、民間が稼げるかを確かめてから選ぶ

2-2　類型ごとの例

A 公共×公共――さいたま市「いーよの」（2020年4月）

小学校に、子育て支援センター、放課後児童クラブ、郷土資料館、地域サロンを複合化した。約2年間の市民ワークショップを経て開設している。**学校を核にした類型 A の典型である。**

A＋B――習志野市「プラッツ習志野」（千葉県、2019年11月）

8施設（7つの建物）を3つの建物に集約した。市で初めてのPFIで、契約額は約72億円、費用の削減効果（VFM）は約2.3億円である。機能を保ったまま、建物を減らした。市自身が「合意形成に労力が必要だった」と記している。

A＋B――秦野市（神奈川県）

保健福祉センターに郵便局を誘致し、年200万円の賃料を得ている。庁舎の敷地には、独立店舗型のコンビニを定期借地で置いた。**大きな再開発でなくても、小さな床や敷地の貸し出しから始められる。**

B 公共×商業――紫波町「オガールプラザ」（岩手県、2012年6月）

図書館・地域交流センター・子育て応援センターと、産直・飲食・医療を一体で整備した。テナントを先に決め、その賃料から建設費を逆算したとされる（第3章、

第5章）。

C 公共×働く場――五城目町「BABAME BASE」（秋田県、2013年10月）

廃校を起業支援の拠点にした。入居した事業者は延べ44件で、入居費は月2万円からである。**人口約8,000人の町でも、「働く場」との複合は成り立つ。**

D 公共×住まい――豊島区庁舎（東京都、2015年5月）

市街地再開発で、庁舎と分譲マンション（432戸）を一体で整備した。旧庁舎の跡地などは76年の定期借地で貸し、約191億円を得た。「実質ゼロ円の庁舎」と報じられた。

> **ただし、地価の高い大都市だから成り立った手法である。**地方の市町村が、そのまま真似できるものではない。

庁舎や図書館にコワーキングを併設した例（類型 C）は全国で増えている。しかし、利用の実績や収支を公開している例は、本書の執筆時点では確認できていない【要確認】。


2-3　類型を選ぶための4つの問い

1. **利用時間帯は補い合うか。**平日昼の学校と、夕方・休日の地域利用のように、空き時間を互いに埋められる組み合わせほど、効率が上がる。
2. **利用者は重なるか。**子育て世代が、図書館と小児科を一度に使えるように、「ついでに寄る」動きが生まれるかどうかが、にぎわいを左右する。
3. **民間が収益を上げられる立地か（市場性）。**市場性が低い場所で B・C・D を狙うと、公募の不調や撤退につながる。その場合は A を軸にし、民間は小さな床から試す。
4. **その場所に残すべき機能か（必需性）。**対象の施設を「残す・束ねる・転じる・畳む」に振り分け、「束ねる」と判断したものを複合化の候補にする。代わりが効かない施設は「残す」、需要がない施設は「畳む」。無理に複合化しない。

1と2は、第1章の外部経済効果の問いである。時間帯が補い合えば、互いの弱い時間を埋める。利用者が重なれば、「ついで」の動きが生まれる。

3と4は、事業として成り立つかの問いである。**1と2が強くても、3が弱ければ、商業は小さく始める。**

図2-2　4つの問いで類型を選ぶ

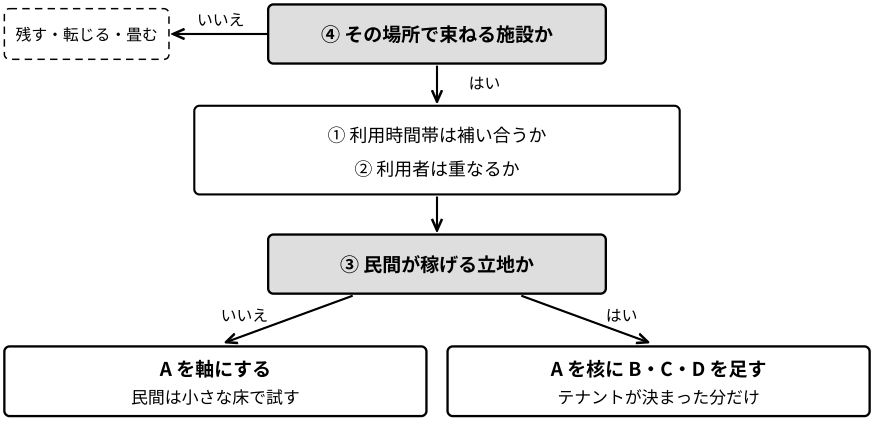

2-4　出発点は、学校を核にした公共×公共

学校は、全国の市区町村が持つ施設の延床面積の約4割を占める（2010年度末時点）。そして、通学区という自然な地域の単位を持つ。

学校の約39%は、すでにほかの公共施設と複合化・共用化している（序章）。ただし相手の多くは、防災備蓄倉庫と放課後児童クラブである。図書館や公民館との本格的な複合化は、まだ少ない。

類型 A を「学校を核」に組むことが、多くの自治体にとって最も現実的な出発点である。詳しくは第4章で扱う。

学校を核にすると、安全管理が必ず問題になる。子どもがいる時間に、地域の人が出入りする。入口と動線を分け、学校の区域と地域の区域の境目を設計で決める（第4章）。

2-5　商業と働く場は、小さな床から足す

類型 B・C は、市場性があれば大きな効果を生む。なければ、空き床を公費で埋め続けることになる（第3章）。

だから、最初から大きく建てない。

- **既存の公共施設の空いた床を、まず貸してみる。**郵便局、コンビニ、カフェなど、小さな床で始められる相手から当たる（秦野市）。
- **期間を区切って試す。**数か月から1〜2年の暫定利用で、手が挙がるか、客が来るかを確かめる。
- **テナントが決まった分だけ建てる。**新築するなら、意向を確かめたテナントの賃料から規模を逆算する（オガール）。

> **「手が挙がらなかった」という結果にも価値がある。**それは、その場所では B・C が成り立たないという実証である。類型 A に絞る判断の材料になる。

2-6　規模別の現実解――理想・次善・最低限

	理想	次善	最低限
人口20万人以上	駅前や中心部で、公共を核に商業（B）や住まい（D）を組み合わせ、民間部分は独立採算にする	庁舎や図書館の建て替えに合わせ、低層部に商業や働く場（B・C）を入れる	既存の公共施設の空き床を、公募で民間に貸す
人口5万〜20万人	学校や庁舎の建て替えを機に、公共×公共（A）を核に、テナントを先に決めて商業（B）を足す	学校を核に、公民館・図書館・放課後児童クラブを束ねる（A）	空き教室や庁舎の空き床に、カフェや郵便局を入れる
人口5万人未満	支所・診療所・図書館の分室・店を一か所に束ね、小さな拠点にする（A＋B）	廃校を、起業や働く場の拠点に転じる（C）	公共施設の一角を、期間を区切って民間に貸し、需要を試す

> **どの規模でも、最初の一歩は「空いている床を貸してみる」ことである。**議決も大きな予算も要らない。手が挙がるかどうかが、次の類型を選ぶ根拠になる。

2-7　デベロッパーから見ると

稼げるか。民間が入るのはB・C・Dである。このうち、地方で最も現実的なのはB、とくに**公共施設を核にした小さな商業**である。公共が人を呼び、商業はその人出に乗る。大きな集客を自前でつくる必要がない。

D（住まい）は、地価の高い場所でなければ、余った容積を売っても整備費に届かない。地方では、店舗付きの公営住宅など、小さな形にとどまる。

どこにリスクがあるか。Aの施設に後からBを足す場合、公共施設の開館時間や安全管理の制約を、商業が背負うことになる。とくに学校を核にした複合では、入口と動線を分けられるかを、計画の最初に確かめる。

自治体に何を確かめるか。三つある。①その施設は「束ねる」と判断されているか（残す・畳むと判断された施設ではないか）、②類型Aの核は何か（学校か、庁舎か、図書館か）、③民間に求めるのは床を借りることか、建てることか、運営することか、である。

2-8　この章で覚えておくこと

複合化の相手を決める前に、**四つの問いに答える。**時間帯は補い合うか、利用者は重なるか、民間が稼げるか、その場所に残すべきか。

答えに迷ったら、学校を核にした公共×公共から始め、商業は空いている床を貸すところから足す。

第3章

地方の再開発はなぜ失敗したか

ポイント

❶ 地方の再開発では、商業ビルにテナントが集まらず、**空いた床を自治体が公共施設で埋める**という結末が繰り返されてきた。
❷ 失敗は個別の努力不足ではない。**構造から起きている**。共通する型は6つある。
❸ 根っこにあるのは、「**商業が主役、公共は脇役（または救済役）」という順序**である。
❹ 複合化は、この順序を逆にする。**毎日人が来る公共機能を核に置き、商業は先に決まったテナントの分だけ足す**。
❺ 既存の空きビルに公共施設を入れるときは、**近くの古い施設を同時に畳む**。施設の総量を増やさない。

3-1　再開発のお金の仕組み

まず、市街地再開発事業の仕組みを押さえる。

市街地再開発事業は、古い建物が建て込んだ区域で、土地と建物をまとめて取り壊し、大きなビルに建て替える事業である。もとの地権者は、持っていた土地や建物の価値に見合った床を、新しいビルの中に受け取る。これを**権利変換**という。

新しいビルは、もとの建物より大きく建てる。地権者に渡した分を超えて増えた床を**保留床**という。事業費の大きな部分は、この保留床を売ったり貸したりした代金と、国や自治体の補助金でまかなう。

	中身	地方で起きやすいこと
権利床	もとの地権者が受け取る床	地権者が商売をやめ、床が空いたままになる
保留床	増えた床。売ったり貸したりして事業費にあてる	買い手や借り手がいない
補助金	国・自治体が事業費の一部を負担する	負担が軽く見え、規模が膨らむ

都市の中心で床の需要が強いときは、この仕組みはよく回る。保留床が高く売れ、その代金で道路や広場も整う。

問題は、地方では保留床の買い手がいないことである。誰も買わない床は、第三セクター（自治体が出資する会社）や自治体自身が引き受けることになる。ここから失敗の連鎖が始まる。

3-2　代表的な失敗例

青森市 アウガ（2001年開業）

事業費185億円の複合ビルである。地下に市場、1〜4階に商業、4〜9階に図書館などの公共施設が入った。

初年度の売上は、計画の52億円に対して約23億円と、半分以下だった。運営する第三セクターは、2015年度末に約24億円の債務超過となった。市は2008年に銀行の債権約23億円を買い取るなど支援を重ねたが、2016年に市長が引責辞任した。2017年2月に商業テナントが一斉に撤退し、2018年1月からは市役所の駅前庁舎として使われている。

秋田市 エリアなかいち（2012年開業）

2012年7月に完成した再開発の拠点である。事業費135億円で、その8割を国・県・市が負担した。商業施設、県立美術館、市のにぎわい交流館「AU」で構成される。整備の前には、中心部の小売の売上が1994年の1,000億円超から2004年の500億円台へ、10年で半減していた。

開業から10年たっても、商業の苦境は好転していないと報じられている。一方で、隣の通りでは客層が広がったとも伝えられ、市は中心市街地の人口の増加や地

価の上昇に一定の成果があったとしている。

> **なかいちは、白黒のつけにくい例である。**美術館と交流館という公共の側は人を呼んだが、商業の床は埋まりきらなかった。公共施設があっても、商業の規模をテナントの賃料から決めていなければ、商業は自分の重さで沈む。

全国の再開発ビル

大阪府がまとめた再開発ビルの空き床対策の事例集には、商業床の空きに公共施設を入れた例が13件挙げられている。北見市（市の分庁舎）、中津川市（市役所機能・多目的ホール）、岡谷市（生涯学習センター・子育て支援館）、久留米市（図書館など）、佐賀市（子育て支援センター・市民センター）、倉敷市（男女共同参画センター）などである。

一つひとつの事例には、それぞれの事情がある。ただ、13件も並ぶと、個別の事情では説明しきれない流れが見えてくる。**商業ビルを建て、商業が埋まらず、公共施設で埋める。**この流れである。

3-3　失敗に共通する6つの型


	型	何が起きるか
1	売上の見込みが楽観的すぎる	人口や商圏が伸びることを前提に計画し、売上や賃料が計画の半分程度で止まる（アウガは初年度で計画の半分以下）
2	お金の仕組みが保留床に頼っている	地方では保留床の買い手がおらず、第三セクターや自治体が引き受ける
3	核となる大型店（キーテナント）に頼っている	百貨店やスーパーが撤退すると、ビル全体が一気に空く
4	郊外化と車社会の現実を見ていない	郊外のバイパス沿いに店が集まり、中心部は人通りも土地の値段も下がり続ける（青森では路線価が開業時の約3分の1に）
5	補助金があるので規模が膨らむ	事業費の多くを公費でまかなえるため、身の丈を超えた床を建てる
6	公共施設があとから「穴埋め」で入る	その場所に置く必然性が薄いまま、床の管理費と修繕の積立てを自治体が払い続ける

6つめの型は、本書のテーマと直接つながる。空き床に公共施設を入れると、見た目は「複合施設」になる。

> **しかし、これは複合化ではない。**近くの古い施設を畳まずに入れれば、施設の総量はむしろ増える。公共施設の総量を減らそうとする計画（公共施設等総合管理計画）と、逆の方向に進む。

6つの型の根っこにあるのは、「商業が主役、公共は脇役（または救済役）」という順序である。**商業の需要が細る地方では、この順序そのものが成り立たない。**

図3-1　失敗の連鎖

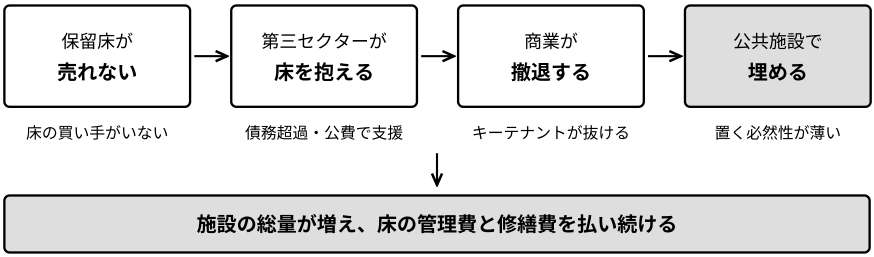

3-4　順序を逆にする


複合化の考え方は、この順序を逆にすることである。公共を核に置き、商業はその人の流れに乗る規模で足す。

	失敗の型（商業先行・公共は穴埋め）	融合の型（公共を核に商業を足す）
出発点	再開発ビルを建てること	公共施設の再編計画（どの機能を中心部に集めるか）
集客の核	百貨店・大型店	図書館・子育て・行政窓口・医療など毎日使う公共機能
商業の規模	計画上の需要から決める	先に決めたテナントの賃料から逆算する
床の持ち方	第三セクターが保留床を抱える	公共部分は自治体が取得、民間部分は民間がリスクを負う
地権者	床を受け取って終わり	業績に連動する地代で一緒にリスクを負う
公共施設	空き床に後から入る	別の施設を畳んで移す（総量を増やさない）
失敗したとき	自治体が債務を肩代わり	契約で決めた見直し・撤退のルールに従う

第1章で見たとおり、公共施設は平日の昼にも安定して人を呼び、景気の影響を受けにくい。地方の中心部で、百貨店に代わって毎日人を呼べるのは、むしろ公共施設のほうである。

集客の核を、商業から公共に置き換える。これが、順序を逆にするということである。

図3-2　二つの順序の比較

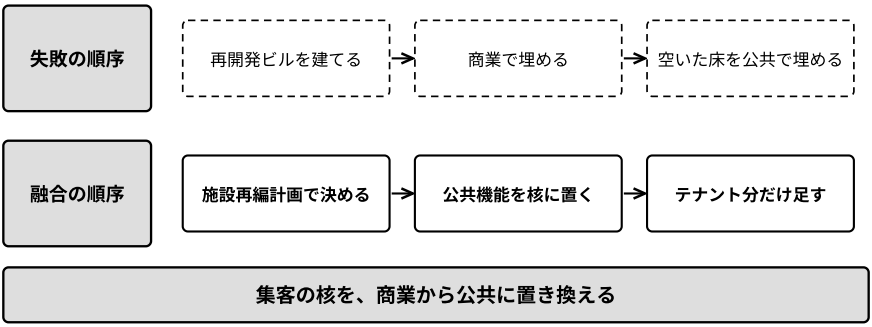

3-5　失敗の型を断ち切った例

ここでは六つの例を見る。丸亀町は**お金とリスクの持ち方**を変えた。オガールとアンフォーレは**集客の核を公共に置き、商業をその流れに乗る規模で足した。**佐世保中央公園は、同じことを建物ではなく公園で行った。シリウスとエンクロスは、駅前の核を公共に置き換えたが、商業はごく小さい。

高松市 丸亀町商店街――リスクの持ち方を変える

丸亀町は、商業を主役にした再生である。集客の核を公共に置き換えた例ではない。学ぶべきは、土地とリスクの扱い方である。

地権者の土地を、まちづくり会社が定期借地でまとめて借りる。土地を持つことと使うことを分け、店の構成を会社が一体で組み立てている。

地権者に払う地代は、会社の業績に連動して毎年見直す。売上が落ちれば、地代も下がる。**地権者は「床を受け取って終わり」ではなく、運営会社と一緒にリスクを分け合う。**保留床を売って事業費をまかなう形（型の2）に頼らず、売上が落ちたときの痛みを一者に集めない仕組みである。

紫波町 オガールプラザ（岩手県、2012年6月開業）――集客の核と規模を変える

図書館などの公共部分を核にして、テナントを先に決めた。建設費は、テナントの賃料から逆算している。工事費約11億円のうち、公共部分の約8億円を町が買い取り、民間部分の約2.7億円は民間が借入れで建てた。民間部分の土地は、32年の事業用定期借地である。

「稼げる規模しか建てない」という考え方は、6つの型の1・2・5を、計画の最初の段階で断ち切っている（第5章、第12章）。**集客の核を公共に置いた、本章のいう「順序を逆にした」例である。**

安城市 アンフォーレ（愛知県、2017年度開館）――病院の跡地を、図書館を核に組み直す

中心市街地にあった総合病院が郊外へ移り、1日約3,000人の来街者が減った。その跡地に、市は図書情報館を核とする拠点施設を整備した。

公共部分は、図書情報館、多目的ホール、カフェなどで、PFIで整備した（契約額約63億円）。公共施設を建てて余った土地は、定期借地で民間に貸した。民間はそこ

にスーパーマーケットとカルチャースクールの商業棟（延床約3,000㎡）を、独立採算で建てている。市には約20年で約3.3億円の借地料が入る。

入館者は、2023年度で約108万人、1日平均約3,200人である。**病院が呼んでいた人の流れを、図書館が引き継いだ。**商業は、その流れに乗る規模で足されている。

佐世保市 佐世保中央公園（長崎県、2022年4月リニューアル）――公園を核に、商業の稼ぎを戻す

中心商店街に近い名切地区では、施設の老朽化や機能の移転で人が減り、治安や路上駐車も課題になっていた。市は2017年に地区のまちづくり構想をつくり、公園を中心市街地の交流の拠点に位置付けた。

整備はPark-PFIで行った。公園の約5.4haに、市の建物で民間が運営する屋内遊び場、芝生広場、駐車場を置いた。そこに、民間が建てるレストラン、カフェ、テイクアウトの飲食店、バーベキュー場、オートキャンプ場、コンビニを足している。民間の施設は20年間の設置で、**その稼ぎを公共部分の整備と運営に充てる。**提案の時点で、運営の充実に回る額は約2.5億円（うち飲食などの利益から約1.4億円）とされた。代表企業と構成企業は市内の企業である。

集客の核は、遊び場と芝生広場という公共の空間であり、商業はその人出に乗る形である。**オガールやアンフォーレと同じ順序を、公園で組んだ例**といえる。リニューアル後の来園者数や商店街への効果は、公表資料では確かめられていない【要確認】（第9章、第12章）。

大和市 シリウス（神奈川県、2016年11月開館）――再開発ビルの核を公共にする

大和駅東側第4地区の市街地再開発事業で建てたビルに、市は図書館、芸術文化ホール、子どもの広場、生涯学習センターをまとめて入れた。**再開発ビルの核を、商業ではなく公共に置いた例である。**

市の施設と民間の施設の割合は95対5で、民間はカフェ1店にとどまる。来館者は開館から7年で累計約1,880万人、年に約230万人と報告されている（他市議会の視察報告による）。

延岡市 エンクロス（宮崎県、2018年4月開業）――百貨店が抜けた駅前を、公共で埋め直す

駅前の百貨店が閉じたあと、市は駅に隣り合う複合施設を整備した。待合、市民活動の場、約4万冊の図書を置き、書店とカフェが入る。運営はカルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）が指定管理者として担う。延岡駅周辺の整備の総額は約46億円で、うちエンクロスは約19億円である。

開館から2年で市民活動は1,730回開かれ、延べ約2.6万人が参加した。一方で、年間の運営費は約1.4億円（うち指定管理料約1億円）かかり、費用に見合う効果の検証が要るとの指摘もある（他市議会の視察報告による）。

> **シリウスとエンクロスは、公共施設だけで駅前に人を呼べることを示した。**ただし、商業の稼ぎで公共を支える形にはなっていない。オガールやアンフォーレのように、借地料や賃料を公共に戻す仕組みまで組むかどうかで、運営費の重さが変わる。

六つの例に共通するのは、**建物より先に、中身――運営する人と入居者――を決めている**ことである。

3-6　融合のための7つの原則

1. **施設再編計画から始める。**再開発の計画ではなく、公共施設等総合管理計画のなかで「中心部に集める機能」と「畳む施設」を先に決める。
2. **公共機能を集客の核にする。**図書館、子育て支援、行政窓口、健診・医療など、毎日人が来る機能を核に据える。商業はその人の流れに乗る規模にとどめる。
3. **テナントを先に決めて規模を逆算する。**サウンディング（民間への事前の意向調査）や仮設の出店で需要を確かめる。そのうえで、入る店が決まった分だけ建てる。
4. **リスクを負う人を分ける。**公共部分は自治体が持ち、商業部分は民間が借入れとリスクを負う。第三セクターに床を抱えさせたり、自治体が債務を保証したりはしない。

5. **土地は売らずに貸す。**定期借地や、業績に連動する地代を使い、地権者と運営会社が同じ方向を向く仕組みにする。
6. **用途を変えられる建物にする。**将来、商業が縮んでも公共や住宅に変えられるよう、柱と床だけの骨組みを長く使い、内装を入れ替えられる設計（スケルトン・インフィル）にする。
7. **既存の空きビルは「再編の受け皿」として使う。**空き床に公共施設を入れるときは、近くの古い施設を同時に畳み、施設の総量を増やさないことを条件にする。

3-7　すでにある空きビルをどうするか

多くの自治体にとって、目の前の課題は新しい再開発ではない。**すでに建っている再開発ビルの空き床である。**ここに公共施設を入れること自体は、悪い選択ではない。中心部に人を呼び戻す手段になる。違いを分けるのは、入れ方である。

確かめること	穴埋めになる入れ方	再編の受け皿になる入れ方
移す施設	新しい施設を足す	近くの古い施設を畳んで移す
施設の総量	増える	増えない（減る）
床の持ち方	自治体が床を買い取り、抱え続ける	借りる期間を区切るか、買う場合は将来の修繕費まで見積もる
修繕・建替えの分担	決めていない	区分所有者との分担を先に決める
置く理由	床が空いているから	中心部に集める機能として計画に位置付けている

再開発ビルは区分所有者が多く、大規模な修繕や建て替えの合意が難しくなりがちである。

> **自治体が床を持つなら、建物の寿命までの修繕費の分担を、買う前に見積もる。**
> 床の代金だけを見て判断すると、あとから重い負担が残る。

都城市 Mallmall（宮崎県、2018年4月開業）――百貨店の跡地を、図書館を核に再生する

再編の受け皿として空きビルを使った例である。

2011年1月、中心部に残った最後の大型店、都城大丸が閉店した。翌年、商工会議所の会員企業が受け皿会社「ハートシティ都城」をつくり、跡地を取得した。市、受け皿会社、商工会議所の三者で再生の方針を決め、市は**旧大丸の跡地にあったセンターモールの建物を改装して、市立図書館を移した。**あわせて、まちなか交流センター、子育て支援センター、保健センター、バスの待合所を置き、建物のあいだを屋根のある広場でつないだ。

整備費は約65億円で、国の交付金と合併特例債などを充てた。図書館は既存の建物を使ったことで、同じ規模の新築より約31億円安くなったとされる。民間はあとから、スーパーとホテルの入る商業施設を2022年4月に開いた。

旧図書館の来館者は年約17万人だった。移転後の図書館は、2024年度末までの累計で約675万人、施設全体では約1,115万人を数える。市内の空き店舗率は30%から17%に下がった。一方で、大通りの空き店舗は減っておらず、商店街への波及は今後の検証が要るとも報告されている（他市議会の視察報告による）。

古い図書館を畳んで、百貨店の跡地に残った建物に移した。施設の総量を増やさずに、中心部の集客の核を公共に置き換えた。商業は、その人の流れを見てから民間が足した。本章の7つの原則を、ほぼそのまま実行した例である。

3-8　規模別の現実解――理想・次善・最低限

	理想	次善	最低限
人口20万人以上	施設再編計画で中心部に集める機能を決め、公共を核にした再開発・建て替えを、テナントを先に決めてから進める	既存の再開発ビルの空き床に、近くの古い施設を畳んで移す	計画中の再開発について、売上と賃料の見込みを第三者に点検させる
人口5万〜20万人	新しいビルは建てず、既存ビルの再生と小規模な連鎖型の建て替えで公共と商業を組み合わせる	空き床を期間を区切って借り、公共機能を試しに置いてから買うかどうかを決める	中心部の空きビルの床の持ち主・修繕積立・空き状況を一覧にする
人口5万人未満	大きな再開発はせず、既存の建物の改修（リノベーション）で公共と小さな店を一体にする	空き店舗の一区画に、窓口や子育て相談を出張で置く	過去の再開発・中心市街地の事業について、計画と実績を比べて公開する

「最低限」の欄は、次の失敗を防ぐための準備である。とくに計画と実績の比較は、どの規模でも始められる。公開すれば、次の計画で同じ見込み違いを繰り返さずに済む。

3-9　デベロッパーから見ると

稼げるか。地方の再開発で商業床を大きく持つ計画は、本章の6つの型のどれかに当たりやすい。事業として危うい。逆に、公共部分を自治体が取得し、民間部分を先に決めたテナントの分だけ建てる計画なら、民間が負うリスクは小さく区切られる。**公共が核になる計画のほうが、民間にとっても読みやすい。**

どこにリスクがあるか。三つある。①自治体の財政事情や首長の交代で、公共部分の取得が遅れる・縮む。②地権者が多く、権利の調整に時間がかかる。③既存ビルでは、区分所有者のあいだで修繕や建て替えの合意がとれない。①は議会の議決（債務負担行為など）の時期を、②③は合意の見通しを、参入の前に確かめる。

自治体に何を確かめるか。四つある。①その場所に集める機能が、公共施設等総合管理計画や個別施設計画で決まっているか。②畳む施設はどれか。③公共部分を取得するか借りるか、その予算の見通し。④不振や撤退のときのルールを契約に書く用意があるか。

3-10　この章で覚えておくこと

再開発の計画を見せられたら、**集客の核が何か**を最初に問う。答えが大型店なら、6つの型を一つずつ当てはめてみる。

そして、空き床に公共施設を入れる話が出たら、**「どの施設を畳むのか」**を問う。答えがなければ、それは複合化ではなく穴埋めである。

第5部　デベロッパーの実務

第17章

公共テナントは商業施設に何をもたらすか

ポイント

❶ 図書館、子育て支援、行政窓口などの公共施設は、商業施設から見れば**平日の昼に人を呼ぶテナント**である。
❷ 利点は4つある。**集客、長く続く賃料、埋めにくい床の活用、施設の信用**である。
❸ 一方で、**民間テナントにはない制約がある**。賃料の水準、単年度の予算、開館時間、公共の仕様、政策が変わったときの撤退である。
❹ 入り方は4つある。どれを選ぶかで、**誰がどのリスクを負うかが決まる**。
❺ 事業計画では、**公共の賃料を固定の収入、集客の効果を上振れの要素**として分けて見込む。

17-1　なぜ今、公共テナントなのか

人口が減り、ネット通販が広がるなかで、商業施設は「物を売る場所」だけでは人を呼びにくくなった。とくに地方の大型店や駅前のビルでは、空いた区画や、物販では埋めにくい広い床が出ている。

自治体の側にも事情がある。古くなった公共施設を同じ場所に建て替える余裕がなく、施設をまとめて数を減らす計画を進めている（第2章）。建物を新しく建てずに、人の集まる場所に公共サービスを置けるなら、自治体にとっても利点がある。

両者の事情が重なるところに、公共テナントという選択肢がある。本章では、デベロッパーや商業施設の運営者の立場から、これを検討する。

17-2　公共テナントがもたらす4つの利点

	利点	中身
1	集客	図書館、子育て支援、行政窓口、健診などは、生活の必要から人を呼ぶ。平日の昼にも人が来て、景気の影響を受けにくい
2	長く続く賃料	自治体が撤退するのは、施設の再編など政策上の理由が中心である。売上の不振では撤退しない
3	埋めにくい床の活用	図書館や子育て広場は、広い床や上の階でも使える。物販のテナントが入りにくい区画を埋められる
4	施設の信用	公共サービスがあることで、施設が「地域の拠点」として認められる。地域との関係も築きやすくなる

1つめの集客は、**時間帯の補い合いに価値がある。**商業施設の人出は、週末と夕方に波がある。公共施設は、平日の昼に安定して人を呼ぶ。子育て中の親が、子育て広場の帰りに食料品を買う。図書館に来た高齢者が、カフェで休む。互いの弱い時間帯を、相手が埋める（第1章）。

ただし、公共施設の来館者が実際にどれだけ買い物をするかを示す公開データは、本書の執筆時点では見つけられていない【要確認】。**集客の効果は、事業計画では上振れの要素として扱う**（17-6）。

17-3　公共テナントの制約

公共テナントには、民間テナントとは違う制約がある。参入の前に知っておくべき点を並べる。

制約	何が起きるか	備え
賃料の水準	自治体は相場を超える賃料を払えない。逆に安すぎると「民間への優遇」と批判される	不動産鑑定などで賃料の根拠を示せるようにする
単年度の予算	自治体の予算は年度ごとに議会で決まる。複数年の賃貸借には、議会の議決（債務負担行為など）が要る	契約の前に、議決の時期と見通しを確かめる
開館時間	公共施設の開館時間と休館日は条例などで決まる。商業施設の営業時間と合わないことがある	入口や動線を分け、時間外の出入りと警備の分担を決める
公共の仕様	図書館の床の重さ、バリアフリー、個人情報を扱う窓口の区画など、求められる仕様が商業より厳しいことがある	内装工事の範囲と費用の分担を、募集の段階で確かめる
政策が変わったときの撤退	首長の交代や再編方針の見直しで、計画の凍結や撤退が起こりうる	中途解約の条件と、原状回復の扱いを契約に書く
公平性	特定の民間施設を選ぶ理由を、住民と議会に説明する必要がある	公募や選定の経緯を記録し、立地を選んだ根拠を示す
企業版ふるさと納税	寄附企業に経済的な見返りを与えることは禁止で、違反すると計画の認定取消の対象になる	寄附する企業と床を貸す（売る）企業が同じなら、価格の根拠と選定の経緯を特に丁寧に示す（第13章）

政策が変わったときの撤退は、デベロッパーが見落としやすいリスクである。愛知県西尾市では、約198億円・約30年の包括PFIの契約が、市長交代後に凍結され、協議が長期化した。

公共テナントは、売上の不振では撤退しない。しかし、政策の変化では動く。その条件を、契約で決めておく。

17-4　4つの入り方


入り方	仕組み	民間の利点	民間の注意点
① 賃貸借	自治体が商業施設の区画を借り、公共サービスを置く	床を持ったまま、賃料を得られる。始めるまでが早い	賃料が毎年の予算に左右される。自治体が移転すると空く
② 今の床を買う（区分所有）	すでにある商業施設の一部の床を、自治体が買って持つ	売却代金が一度に入る。公共が長く腰を据える	修繕や建て替えに、自治体との合意が要る。商業部分が衰退しても自治体が抜け出しにくく、話し合いが重くなる
③ 新築で買う（建てる前に約束する）	着工の前に、自治体が「この広さと仕様の公共部分を、完成したら買う」と約束し、民間がそれに合わせて建てる	買い手が先に決まるので、建設資金を集めやすい	着工の前に自治体の予算の議決が要る。議決が遅れると、資金計画が狂う
④ 定期借地	自治体が公有地を期限付きで民間に貸し、民間が商業施設を建てる	土地を買わずに済み、初期投資が軽い	期限が来たら更地にして返すのが原則。投資を期限内に回収する必要がある

②と③は、どちらも自治体が床を買う。**違いは、床がいつ、誰の注文でできるかである。**

- **②は、今ある床を買う。**床の広さや形は、商業施設の都合ですでに決まっている。自治体は、空いた区画などを選んで買う。
- **③は、建てる前に「完成したら買う」と約束する。**自治体が公共部分の広さと仕様を先に示し、民間はそれに合わせて設計して建てる。図書館の床の重さや窓口の区画を、最初から設計に入れられる。

③で買った公共部分が商業と同じ建物にあれば、買ったあとは②と同じく区分所有になる。違うのは入口の段階である。

図17-1　4つの入り方と、お金・床の流れ

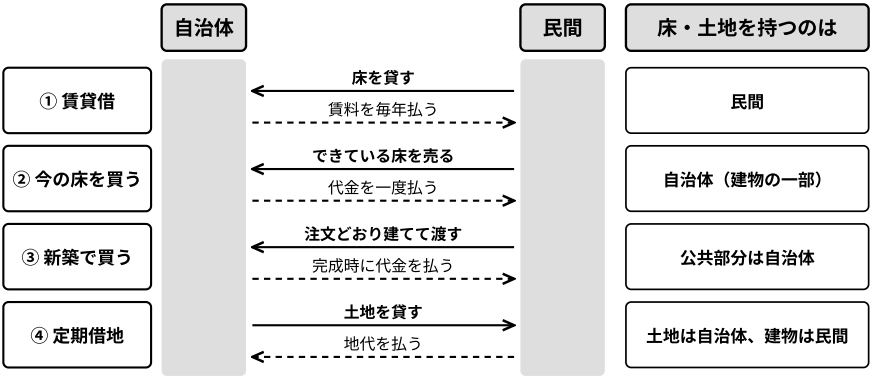

実線は床・土地の動き、点線はお金の動き

③と④は、組み合わせて使える。紫波町のオガールプラザがその例である（17-5）。

17-5　事例

紫波町 オガールプラザ（岩手県、2012年6月開業）――③と④の組み合わせ

民間の会社が、図書館・地域交流センター・子育て応援センターなどの公共部分と、産直・飲食・医療の民間部分を一体で建てた。工事費約11億円のうち、公共部分の約8億円を町が買い取り、民間部分の約2.7億円は民間が借入れでまかなった。民間部分の土地は32年の事業用定期借地で、地代は年348万円である。地代と税で、年約3千万円が町の収入になっている。

テナントを先に決め、その賃料から建設費を逆算して資金を調達したとされる。公共部分が集客の核になり、民間部分は「稼げる規模しか建てない」設計である。

ホルトホール大分（大分市、2013年7月開館）――公共と民間を事業方式で切り分ける

大分駅南に、市民ホール、市民図書館、社会福祉保健センター、保育所、子育て交流センターなどを集め、約1,500㎡の店舗・事務所も併設した。延床面積は約36,500㎡である。

公共部分は民間が建てて運営し、市が対価を払う。**民間部分は独立採算である。**募集のときには、民間部分を「別棟（土地を借りる）・合築・公共施設内のテナント」のどの形でも提案できるようにしていた（市の募集要項による）。「市が対価を払う部分」と「民間が自ら稼ぐ部分」を分けたことで、それぞれのリスクの持ち方がはっきりしている。

旧大宮図書館「Bibli」（さいたま市、2021年12月供用開始）——公共の建物に民間が入る

図書館の移転で空いた建物を、民間事業者が約2.5億円で改修し、飲食などのテナントに転貸している。市には年約900万円の賃料が入る。約10年の賃貸借である。

公共テナントの「逆向き」の例である。民間から見ると、**自治体が手放した建物は、立地のよい床を改修費だけで手に入れる機会**になる。

秦野市（神奈川県）——小さな床と敷地から

保健福祉センターに郵便局を誘致し（年200万円の賃料）、庁舎の敷地には独立店舗型のコンビニを定期借地で置いた。大きな再開発でなくても、小さな床や敷地の貸し借りから、公共と民間の組み合わせは始められる。

南アルプス市 南アルプスIC周辺整備事業（山梨県、2028年度開業予定）——公募で選ばれた商業施設に子育て・交流の場

市が進める同事業の中央エリア活用の公募で、株式会社IDOMが選ばれ、2026年5月に市と立地協定を結んだ。敷地約3.3haに、リユース商品の店舗と、屋内外のキッズエリア、絵本・児童書をそろえるブックミュージアム、地域の祭りやイベントに使う広場を備えた複合商業施設を計画している（IDOM社の発表による）。公共の関わり方の詳細は公表されていない。

反面の例——青森市 アウガ

商業と図書館などの公共施設が一つのビルに入った例である。しかし、商業の売上が計画の半分以下にとどまり、運営する第三セクターが事実上破綻した（第3章）。

公共テナントがいても、商業の規模が需要を超えていれば、ビルは支えられない。公共テナントは集客の核になるが、商業の見込み違いを埋め合わせるものではない。

17-6　事業計画での見込み方

公共テナントを入れた事業計画では、収入を分けて見込む。

	見込み方	理由
公共の賃料（または売却代金）	固定の収入として見込む	契約で額と期間が決まる。売上の不振では減らない
公共施設による集客の効果	上振れの要素として見込み、確実な収入には入れない	来館者の買い回りを示す公開データが乏しい【要確認】
政策変更による撤退	中途解約の条件を契約で決め、その場合の空き期間を感応度分析に入れる	首長の交代や再編方針の見直しで起こりうる

集客の効果を確実な収入として織り込まない。これが、アウガと逆の側に立つための条件である。

開業後は、公共施設の来館者数と、同じ時間帯の商業の客数や売上を記録しておく。次の案件の根拠になる。公表できる形で記録を残すことを、自治体と協定で決めておくのも一つの方法である。

17-7　規模別の現実解――理想・次善・最低限

デベロッパーの立場から、自治体の規模ごとに狙える形を整理する。

	理想	次善	最低限
人口20万人以上	駅前の再編で、公共部分を自治体が取得し、民間部分を独立採算で建てる（③、または事業方式での切り分け）	既存の商業施設に、図書館や子育て支援を賃貸借で入れる（①）	移転で空く公共の建物を借りて改修し、テナントに転貸する
人口5万〜20万人	公有地の定期借地と公共部分の買い取りを組み合わせ、テナントを先に決めて規模を逆算する（③＋④）	商業施設の空き区画や上の階に、子育て広場や行政窓口を賃貸借で入れる（①）	商業施設の一角に、出張窓口や相談会を期間を区切って置く
人口5万人未満	スーパーや道の駅に、支所・図書館の分室・子育て相談をまとめて入れる	公共施設の空き床や敷地に、郵便局やコンビニを入れる（秦野市型）	店の前や駐車場で、自治体と共催の市（いち）や催しを開く

小さな自治体ほど、商業施設は数少ない「人が集まる場所」である。大きな開発でなくても、窓口や相談会を置くところから始められる。

17-8　自治体から見ると

この章はデベロッパーに向けて書いた。自治体の担当者は、裏返して読んでいただきたい。

民間は何を気にしているか。三つある。①賃料と期間が契約でどこまで確かになるか、②政策が変わったときに何が起きるか、③開館時間や仕様の制約がどこまで重いか。**これらを募集の段階で示せる自治体ほど、提案が集まる。**

どこで失敗するか。商業施設に入ること自体を目的にすると、その場所に置く理由が薄くなる。第3章の「穴埋め」と同じ形になる。入居は、施設を畳んで移すための手段として計画に位置付ける。

何を先に決めるか。四つある。①移す施設と畳む施設、②借りるか買うか、③予算の見通しと議会への諮り方、④撤退のときのルールである。

17-9　この章で覚えておくこと

公共テナントの話が来たら、まず**「この施設は、どの施設を畳んで移ってくるのか」**を自治体に聞く。答えが計画に書いてあれば、その入居は長く続く。書いてなければ、政策が変わったときに動く。

そして、事業計画の表では、**公共の賃料と集客の効果を別の行に書く。**
