# 公共施設の複合化

――「減らす」から「組み替える」へ

商業・文化・福祉・交通を「広場」でつなぐ――自治体とデベロッパーの実務

上村　章文

---

見本紙面（第1章・第3章・第17章）
A5判。本文は明朝、見出し・表・柱はゴシック。ページ番号は見本用の通し番号です。

# 第1部　考え方

第1章

# 外部経済効果を「広場」でつなぐ

**ポイント**

❶ **商業施設にも公共施設にも、外部経済効果がある**。使う人の外にまで、便益が広がる。
❷ 二つの効果は性格が違う。**公共は平日の昼に、商業は週末と夕方に人を呼ぶ**。だから組み合わせると強くなる。
❸ 自動車社会は、施設を道路と駐車場で切り離した。**効果は互いに届かなくなった**。
❹ 複合化は建物の中で完結させない。**建物の前に広場を置き、入口を広場に向ける**。
❺ **広場はつくるだけでは人が集まらない**。運営する人と予算を、建物と同時に用意する。

## 1-1　外部経済効果とは何か

施設を使う人だけでなく、まわりの人や店にも便益が広がる。この効果を**外部経済効果**という。

商店街で考える。店が集まっていると、客は一軒で用を済ませない。歩いて何軒も回る。ある店を目当てに来た客が、隣の店でも買い物をする。店が集まること自体が、それぞれの店の売上を押し上げる。これが商業の外部経済効果である。

公共施設にも同じ力がある。役所の窓口、図書館、病院、子育て支援センターは、毎日、決まって人を呼ぶ。その人たちが帰りに買い物をし、お茶を飲む。公共施設は料金ではほとんど稼がない。しかし、まわりの店から見れば、**毎日人を連れてきてくれる装置**である。

二つの効果は、性格が違う。

| | 商業施設の外部経済効果 | 公共施設の外部経済効果 |
|---|---|---|
| 人を呼ぶ理由 | 品ぞろえ、楽しさ、値段 | 手続、学び、子育て、医療など生活の必要 |
| 人の来かた | 週末や夕方に波がある | 平日の昼にも安定して来る |
| 景気の影響 | 受けやすい | 受けにくい |
| 本人の稼ぎ | 売上として回収する | 料金ではほとんど回収しない |

この違いがあるから、組み合わせると強くなる。公共施設は平日の昼に安定して人を呼び、商業施設は週末と夕方ににぎわいをつくる。互いの弱い時間帯を、相手が埋める。

**複合化の価値は、面積が減ることより、二つの効果を同じ場所で重ねられることにある。**

## 1-2　自動車社会が分断したもの

車で移動する社会では、施設ごとに駐車場を持つ。人は目的地だけに行って帰る。役所は郊外の広い敷地に移り、商業は幹線道路沿いの大型店に集まり、病院やホールはまた別の場所に建った。

施設どうしが道路と駐車場で切り離されると、それぞれの外部経済効果は互いに届かない。役所に来た人は、用事を済ませると車でまっすぐ帰る。帰りに寄るはずだった店は、遠すぎて寄れない。歩いて回る人がいなくなった中心部の商店街から、衰退が進んだ。


青森市では、郊外のバイパス沿いに店が集まり、中心部の路線価は再開発ビルの開業時の約3分の1まで下がったと報じられている（第3章）。

| | 自動車社会の配置 | 広場を中心にした配置 |
|---|---|---|
| 施設の場所 | 役所・病院・大型店がばらばらの場所にある | 役所・文化施設・商業が広場を囲む |
| 人の動き | 車で目的地だけに行って帰る | 歩いていくつもの施設を回る |
| 外部経済効果 | 施設ごとに閉じ、まわりに届かない | 広場で重なり、互いを高め合う |
| 公共の空間 | 道路と駐車場 | 広場と歩行者の空間 |
| 商店街 | 衰退する | 回遊する人の受け皿になる |

ここで大事なのは、施設の一つひとつは悪くないということである。郊外の役所も、大型店も、それぞれの理屈で正しい場所を選んだ。問題は、全体として効果を打ち消し合う配置になったことである。

**施設を一つずつ建て替える限り、この配置は直らない。**複合化は、配置そのものを組み替える数少ない機会である。

**図1-1　自動車社会の配置と、広場を中心にした配置**

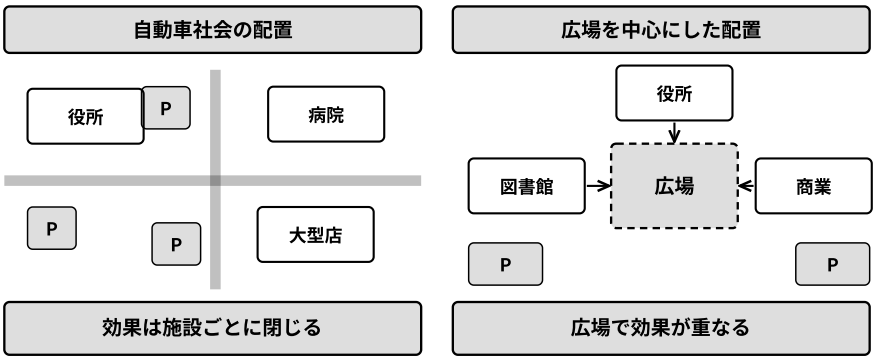


## 1-3　ヨーロッパの広場に学ぶ

ヨーロッパの都市では、中世から市庁舎・教会・市場が一つの広場を囲んできた。行政と祈りと商いが同じ場所に集まり、人の行き来そのものがまちの価値になっている。

- **シエナのカンポ広場（イタリア）**——市場や競技、行事の場として使われてきた。市庁舎のプッブリコ宮が面している。1349年に全体が舗装された。
- **ドイツの町のマルクト広場**——「市場の広場」という名のとおり、市庁舎と教会が面し、定期市が開かれる町の中心である。
- **コペンハーゲンのストロイエ（デンマーク）**——現代になって車を道路から外した例である。1962年に約1.1kmの通りを歩行者専用にした。歩行者の空間は約1.58万㎡から約10万㎡に広がった。

三つに共通するのは、**広場が「建物と建物のあいだの余り」ではなく、まちの主役として設計されている**ことである。施設の入口は広場に向き、人は広場を通って施設

に入る。広場に出ると、ほかの施設が目に入る。

ストロイエには、もう一つ教訓がある。車を外すとき、多くの商店主が「客が減る」と反対した。結果は逆だった。買い物客やカフェが増え、早くに成功した。**歩く人が増えると、商業の外部経済効果が回り始める。**日本の中心市街地で同じ議論をするとき、この経験は判断の材料になる。

## 1-4　日本での実践と国の制度

日本にも、広場で分断をつなぎ直した例がある。

- **富山市 グランドプラザ（2007年）**——再開発の区域内にあった路地のような市道をまとめ、両側の建物を後退させてつくった屋根付きの広場である。路面電車の停留所で降りた人が、広場を通って商業施設や商店街へ向かう流れが生まれた。**道路を広場に変えて、分断をつなぎ直した例**である。
- **紫波町 オガール（岩手県）**——図書館などの公共施設と商業の建物が、中央の広場を囲んで配置されている（第5章、第12章）。

国も制度を整えた。2020年9月施行の都市再生特別措置法の改正で、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」をつくる制度ができている。

| 制度 | 中身 | 複合化での使いどころ |
|---|---|---|
| まちなかウォーカブル推進事業 | 街路を広場に変える整備などを支援する | 複合施設の前の道路を広場にする |
| 民間の敷地を広場として開放したときの固定資産税の軽減 | 民間が自分の敷地を公共の広場として使わせる場合に税を軽くする | 商業施設の前庭を、公共施設と共有の広場にする |
| 歩行者利便増進道路（ほこみち） | 道路を歩行者のために使う。公募で選ばれた者は最長20年の占用ができる | 広場に面した道路にカフェや売店を出す |

## 1-5　広場を中心に組む4つの原則


1. **複合化を建物の中だけで完結させない。**建物の前に広場を置き、公共施設・文化施設・商業の入口を広場に向ける。建物の中を通路でつなぐだけでは、外から人は入ってこない。

2. **公共施設を散らさない。**役所、図書館、ホールの建て替え先は、郊外の広い敷地ではなく、広場を囲む場所に選ぶ。建て替えの時期がずれていても、置く場所だけは先に決めておける。
3. **道路と駐車場で分断しない。**駐車場は外周にまとめ、広場のまわりは歩いて回れるようにする。必要なら道路の一部を広場に変える。
4. **広場の運営者と予算を先に決める。**マルシェやイベント、清掃を担う人（まちづくり会社や指定管理者）とその費用を、建物と同時に用意する。

4つめが、いちばん見落とされる。広場は、建物と違って、完成した日から自然に使われるものではない。

> **誰が、いつ、何のために使うのかを決めていない広場は、ただの空き地になる。**
> 建物の工事費と同じ表に、広場の運営費を書いておく。

**図1-2　広場を囲む施設の配置（入口の向きと駐車場の位置）**

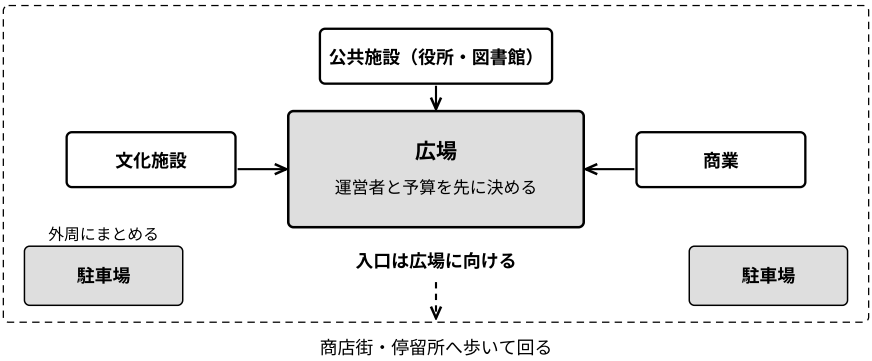


## 1-6　規模別の現実解――理想・次善・最低限

広場をつくれるのは、大きな都市だけではない。規模に応じて、できることがある。

| | 理想 | 次善 | 最低限 |
|---|---|---|---|
| 人口20万人以上 | 中心部の再編で、市庁舎・図書館・ホールと商業が広場を囲む配置にする。道路の一部を広場に変える | 再開発や建て替えの区域内に、屋根付きの広場を一つ設ける | 既存の公共施設の前庭を、イベントや出店に使えるよう規則を変える |
| 人口5万〜20万人 | 学校や庁舎の建て替えに合わせ、公共施設と商業を一つの敷地にまとめ、中央に広場を置く | 複合施設の入口側に広場を設け、駐車場を裏に回す | 庁舎や図書館の駐車場の一角を、週末だけ広場として使う |
| 人口5万人未満 | 支所・診療所・図書館・店を一か所にまとめた拠点の前に、小さな広場を置く | 道の駅や商業施設の前の空間を、公共の催しにも使えるよう協定を結ぶ | 公民館の前の空き地で、月1回の市（いち）を開く |

**「最低限」の欄は、予算がなくても今年度から始められる。**広場の使い方を一度でも試すと、どこに人が来て、何が足りないかが分かる。大きな整備の前に、ここから始める。

## 1-7　デベロッパーから見ると

**稼げるか。**公共施設が平日の昼に人を呼べば、商業施設の弱い時間帯が埋まる。広場が施設の前にあれば、その人出が店の前を通る。

ただし、公共施設の来館者が実際にどれだけ買い回るかを示す公開データは、本書の執筆時点では見つけられていない【要確認】。**事業計画では、この効果を上振れの要素として扱い、確実な収入としては見込まない。**それが安全である。

**どこにリスクがあるか。**広場の運営費を誰が持つかが曖昧なまま始まると、清掃や警備の費用が商業側に寄ってくる。広場を共有するなら、運営者と費用の分担を協定に書く。

**自治体に何を確かめるか。**三つある。①広場の所有と管理の区分、②広場での出店やイベントの許可の手続、③駐車場の配置と台数の考え方（公共施設の利用者と商業の客で共用するか）である。

## 1-8　この章で覚えておくこと

複合化の図面を見せられたら、まず建物の外を見る。**入口がどこを向いているか、建物の前に誰でも入れる場所があるか。**それだけで、その計画が外部経済効果をつなごうとしているかどうかが分かる。

そして、広場の欄に運営費が書いてなければ、そこを最初に問う。

第3章

# 地方の再開発はなぜ失敗したか

**ポイント**

❶ 地方の再開発では、商業ビルにテナントが集まらず、**空いた床を自治体が公共施設で埋める**という結末が繰り返されてきた。
❷ 失敗は個別の努力不足ではない。**構造から起きている**。共通する型は6つある。
❸ 根っこにあるのは、「**商業が主役、公共は脇役（または救済役）」という順序**である。
❹ 複合化は、この順序を逆にする。**毎日人が来る公共機能を核に置き、商業は先に決まったテナントの分だけ足す**。
❺ 既存の空きビルに公共施設を入れるときは、**近くの古い施設を同時に畳む**。施設の総量を増やさない。

## 3-1　再開発のお金の仕組み

まず、市街地再開発事業の仕組みを押さえる。

市街地再開発事業は、古い建物が建て込んだ区域で、土地と建物をまとめて取り壊し、大きなビルに建て替える事業である。もとの地権者は、持っていた土地や建物の価値に見合った床を、新しいビルの中に受け取る。これを**権利変換**という。

新しいビルは、もとの建物より大きく建てる。地権者に渡した分を超えて増えた床を**保留床**という。事業費の大きな部分は、この保留床を売ったり貸したりした代金と、国や自治体の補助金でまかなう。

| | 中身 | 地方で起きやすいこと |
|---|---|---|
| 権利床 | もとの地権者が受け取る床 | 地権者が商売をやめ、床が空いたままになる |
| 保留床 | 増えた床。売ったり貸したりして事業費にあてる | 買い手や借り手がいない |
| 補助金 | 国・自治体が事業費の一部を負担する | 負担が軽く見え、規模が膨らむ |

都市の中心で床の需要が強いときは、この仕組みはよく回る。保留床が高く売れ、その代金で道路や広場も整う。

**問題は、地方では保留床の買い手がいないことである。**誰も買わない床は、第三セクター（自治体が出資する会社）や自治体自身が引き受けることになる。ここから失敗の連鎖が始まる。

## 3-2　代表的な失敗例

### 青森市 アウガ（2001年開業）

事業費185億円の複合ビルである。地下に市場、1〜4階に商業、4〜9階に図書館などの公共施設が入った。

初年度の売上は、計画の52億円に対して約23億円と、半分以下だった。運営する第三セクターは、2015年度末に約24億円の債務超過となった。市は2008年に銀行の債権約23億円を買い取るなど支援を重ねたが、2016年に市長が引責辞任した。2017年2月に商業テナントが一斉に撤退し、2018年1月からは市役所の駅前庁舎として使われている。

### 秋田市 エリアなかいち（2012年開業）

事業費135億円で、その8割を国・県・市が負担した。商業施設、県立美術館、市のにぎわい交流館で構成される。開業から10年たっても商業の苦境は好転していないと報じられている。

**全国の再開発ビル**

大阪府がまとめた再開発ビルの空き床対策の事例集には、商業床の空きに公共施設を入れた例が13件挙げられている。北見市（市の分庁舎）、中津川市（市役所機能・多目的ホール）、岡谷市（生涯学習センター・子育て支援館）、久留米市（図書館など）、佐賀市（子育て支援センター・市民センター）、倉敷市（男女共同参画センター）などである。

一つひとつの事例には、それぞれの事情がある。ただ、13件も並ぶと、個別の事情では説明しきれない流れが見えてくる。**商業ビルを建て、商業が埋まらず、公共施設で埋める。**この流れである。

## 3-3　失敗に共通する6つの型


| | 型 | 何が起きるか |
|---|---|---|
| 1 | 売上の見込みが楽観的すぎる | 人口や商圏が伸びることを前提に計画し、売上や賃料が計画の半分程度で止まる（アウガは初年度で計画の半分以下） |
| 2 | お金の仕組みが保留床に頼っている | 地方では保留床の買い手がおらず、第三セクターや自治体が引き受ける |
| 3 | 核となる大型店（キーテナント）に頼っている | 百貨店やスーパーが撤退すると、ビル全体が一気に空く |
| 4 | 郊外化と車社会の現実を見ていない | 郊外のバイパス沿いに店が集まり、中心部は人通りも土地の値段も下がり続ける（青森では路線価が開業時の約3分の1に） |
| 5 | 補助金があるので規模が膨らむ | 事業費の多くを公費でまかなえるため、身の丈を超えた床を建てる |
| 6 | 公共施設があとから「穴埋め」で入る | その場所に置く必然性が薄いまま、床の管理費と修繕の積立てを自治体が払い続ける |

6つめの型は、本書のテーマと直接つながる。空き床に公共施設を入れると、見た目は「複合施設」になる。

> **しかし、これは複合化ではない。**近くの古い施設を畳まずに入れれば、施設の総量はむしろ増える。公共施設の総量を減らそうとする計画（公共施設等総合管理計画）と、逆の方向に進む。

6つの型の根っこにあるのは、「商業が主役、公共は脇役（または救済役）」という順序である。**商業の需要が細る地方では、この順序そのものが成り立たない。**

**図3-1　失敗の連鎖**

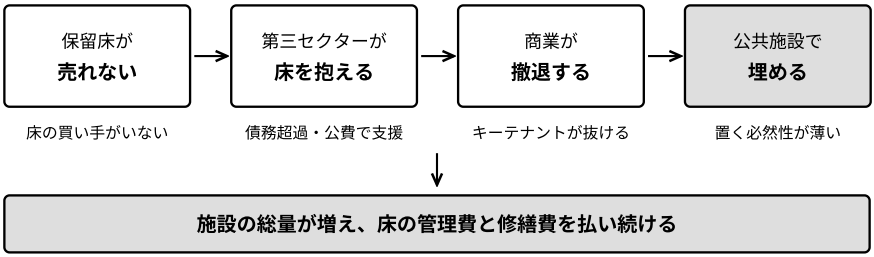


## 3-4　順序を逆にする


複合化の考え方は、この順序を逆にすることである。公共を核に置き、商業はその人の流れに乗る規模で足す。

| | 失敗の型（商業先行・公共は穴埋め） | 融合の型（公共を核に商業を足す） |
|---|---|---|
| 出発点 | 再開発ビルを建てること | 公共施設の再編計画（どの機能を中心部に集めるか） |
| 集客の核 | 百貨店・大型店 | 図書館・子育て・行政窓口・医療など毎日使う公共機能 |
| 商業の規模 | 計画上の需要から決める | 先に決めたテナントの賃料から逆算する |
| 床の持ち方 | 第三セクターが保留床を抱える | 公共部分は自治体が取得、民間部分は民間がリスクを負う |
| 地権者 | 床を受け取って終わり | 業績に連動する地代で一緒にリスクを負う |
| 公共施設 | 空き床に後から入る | 別の施設を畳んで移す（総量を増やさない） |
| 失敗したとき | 自治体が債務を肩代わり | 契約で決めた見直し・撤退のルールに従う |

第1章で見たとおり、公共施設は平日の昼にも安定して人を呼び、景気の影響を受けにくい。地方の中心部で、百貨店に代わって毎日人を呼べるのは、むしろ公共施設のほうである。

**集客の核を、商業から公共に置き換える。**これが、順序を逆にするということである。

**図3-2　二つの順序の比較**

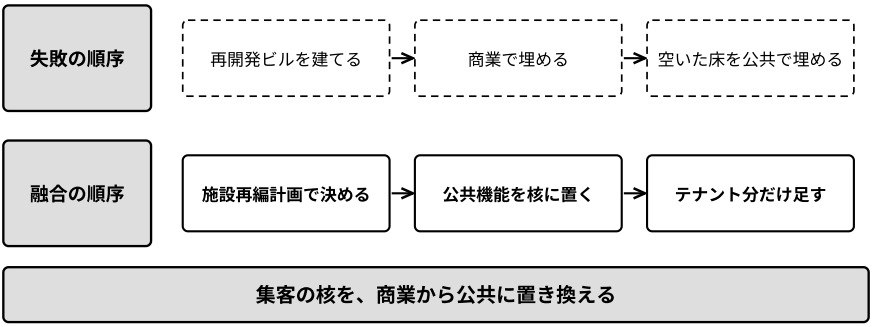


## 3-5　順序を逆にした成功例

### 高松市 丸亀町商店街

地権者の土地を、まちづくり会社が定期借地でまとめて借りる。土地を持つことと使うことを分け、店の構成を会社が一体で組み立てている。

地権者に払う地代は、会社の業績に連動して毎年見直す。売上が落ちれば、地代も下がる。**地権者は「床を受け取って終わり」ではなく、運営会社と一緒にリスクを分け合う。**

### 紫波町 オガールプラザ（岩手県、2012年6月開業）

図書館などの公共部分を核にして、テナントを先に決めた。建設費は、テナントの賃料から逆算している。工事費約11億円のうち、公共部分の約8億円を町が買い取り、民間部分の約2.7億円は民間が借入れで建てた。民間部分の土地は、32年の事業用定期借地である。

「稼げる規模しか建てない」という考え方は、6つの型の1・2・5を、計画の最初の段階で断ち切っている（第5章、第12章）。

二つの例に共通するのは、**建物より先に、中身――運営する人と入居者――を決めている**ことである。

## 3-6　融合のための7つの原則

1. **施設再編計画から始める。**再開発の計画ではなく、公共施設等総合管理計画のなかで「中心部に集める機能」と「畳む施設」を先に決める。
2. **公共機能を集客の核にする。**図書館、子育て支援、行政窓口、健診・医療など、毎日人が来る機能を核に据える。商業はその人の流れに乗る規模にとどめる。
3. **テナントを先に決めて規模を逆算する。**サウンディング（民間への事前の意向調査）や仮設の出店で需要を確かめる。そのうえで、入る店が決まった分だけ建てる。
4. **リスクを負う人を分ける。**公共部分は自治体が持ち、商業部分は民間が借入れとリスクを負う。第三セクターに床を抱えさせたり、自治体が債務を保証したりはしない。
5. **土地は売らずに貸す。**定期借地や、業績に連動する地代を使い、地権者と運営会社が同じ方向を向く仕組みにする。
6. **用途を変えられる建物にする。**将来、商業が縮んでも公共や住宅に変えられるよう、柱と床だけの骨組みを長く使い、内装を入れ替えられる設計（スケルトン・インフィル）にする。
7. **既存の空きビルは「再編の受け皿」として使う。**空き床に公共施設を入れるときは、近くの古い施設を同時に畳み、施設の総量を増やさないことを条件にする。

## 3-7　すでにある空きビルをどうするか

多くの自治体にとって、目の前の課題は新しい再開発ではない。**すでに建っている再開発ビルの空き床である。**ここに公共施設を入れること自体は、悪い選択ではない。中心部に人を呼び戻す手段になる。違いを分けるのは、入れ方である。

| 確かめること | 穴埋めになる入れ方 | 再編の受け皿になる入れ方 |
|---|---|---|
| 移す施設 | 新しい施設を足す | 近くの古い施設を畳んで移す |
| 施設の総量 | 増える | 増えない（減る） |
| 床の持ち方 | 自治体が床を買い取り、抱え続ける | 借りる期間を区切るか、買う場合は将来の修繕費まで見積もる |
| 修繕・建替えの分担 | 決めていない | 区分所有者との分担を先に決める |
| 置く理由 | 床が空いているから | 中心部に集める機能として計画に位置付けている |

再開発ビルは区分所有者が多く、大規模な修繕や建て替えの合意が難しくなりがちである。

**自治体が床を持つなら、建物の寿命までの修繕費の分担を、買う前に見積もる。**
床の代金だけを見て判断すると、あとから重い負担が残る。

## 3-8　規模別の現実解――理想・次善・最低限

| | 理想 | 次善 | 最低限 |
|---|---|---|---|
| 人口20万人以上 | 施設再編計画で中心部に集める機能を決め、公共を核にした再開発・建て替えを、テナントを先に決めてから進める | 既存の再開発ビルの空き床に、近くの古い施設を畳んで移す | 計画中の再開発について、売上と賃料の見込みを第三者に点検させる |
| 人口5万〜20万人 | 新しいビルは建てず、既存ビルの再生と小規模な連鎖型の建て替えで公共と商業を組み合わせる | 空き床を期間を区切って借り、公共機能を試しに置いてから買うかどうかを決める | 中心部の空きビルの床の持ち主・修繕積立・空き状況を一覧にする |
| 人口5万人未満 | 大きな再開発はせず、既存の建物の改修（リノベーション）で公共と小さな店を一体にする | 空き店舗の一区画に、窓口や子育て相談を出張で置く | 過去の再開発・中心市街地の事業について、計画と実績を比べて公開する |

**「最低限」の欄は、次の失敗を防ぐための準備である。**とくに計画と実績の比較は、どの規模でも始められる。公開すれば、次の計画で同じ見込み違いを繰り返さずに済む。

## 3-9　デベロッパーから見ると

**稼げるか。**地方の再開発で商業床を大きく持つ計画は、本章の6つの型のどれかに当たりやすい。事業として危うい。逆に、公共部分を自治体が取得し、民間部分を先に決めたテナントの分だけ建てる計画なら、民間が負うリスクは小さく区切られる。**公共が核になる計画のほうが、民間にとっても読みやすい。**

**どこにリスクがあるか。**三つある。①自治体の財政事情や首長の交代で、公共部分の取得が遅れる・縮む。②地権者が多く、権利の調整に時間がかかる。③既存ビルでは、区分所有者のあいだで修繕や建て替えの合意がとれない。①は議会の議決（債務負担行為など）の時期を、②③は合意の見通しを、参入の前に確かめる。

**自治体に何を確かめるか。**四つある。①その場所に集める機能が、公共施設等総合管理計画や個別施設計画で決まっているか。②畳む施設はどれか。③公共部分を取得するか借りるか、その予算の見通し。④不振や撤退のときのルールを契約に書く用意があるか。

## 3-10　この章で覚えておくこと

再開発の計画を見せられたら、**集客の核が何か**を最初に問う。答えが大型店なら、6つの型を一つずつ当てはめてみる。

そして、空き床に公共施設を入れる話が出たら、**「どの施設を畳むのか」**を問う。答えがなければ、それは複合化ではなく穴埋めである。

# 第5部　デベロッパーの実務

第17章

# 公共テナントは商業施設に何をもたらすか

**ポイント**

❶ 図書館、子育て支援、行政窓口などの公共施設は、商業施設から見れば**平日の昼に人を呼ぶテナント**である。
❷ 利点は4つある。**集客、長く続く賃料、埋めにくい床の活用、施設の信用**である。
❸ 一方で、**民間テナントにはない制約がある**。賃料の水準、単年度の予算、開館時間、公共の仕様、政策が変わったときの撤退である。
❹ 入り方は4つある。どれを選ぶかで、**誰がどのリスクを負うかが決まる**。
❺ 事業計画では、**公共の賃料を固定の収入、集客の効果を上振れの要素**として分けて見込む。

## 17-1　なぜ今、公共テナントなのか

人口が減り、ネット通販が広がるなかで、商業施設は「物を売る場所」だけでは人を呼びにくくなった。とくに地方の大型店や駅前のビルでは、空いた区画や、物販では埋めにくい広い床が出ている。

自治体の側にも事情がある。古くなった公共施設を同じ場所に建て替える余裕がなく、施設をまとめて数を減らす計画を進めている（第2章）。建物を新しく建てずに、人の集まる場所に公共サービスを置けるなら、自治体にとっても利点がある。

**両者の事情が重なるところに、公共テナントという選択肢がある。**本章では、デベロッパーや商業施設の運営者の立場から、これを検討する。

## 17-2　公共テナントがもたらす4つの利点

| | 利点 | 中身 |
|---|---|---|
| 1 | 集客 | 図書館、子育て支援、行政窓口、健診などは、生活の必要から人を呼ぶ。平日の昼にも人が来て、景気の影響を受けにくい |
| 2 | 長く続く賃料 | 自治体が撤退するのは、施設の再編など政策上の理由が中心である。売上の不振では撤退しない |
| 3 | 埋めにくい床の活用 | 図書館や子育て広場は、広い床や上の階でも使える。物販のテナントが入りにくい区画を埋められる |
| 4 | 施設の信用 | 公共サービスがあることで、施設が「地域の拠点」として認められる。地域との関係も築きやすくなる |

1つめの集客は、**時間帯の補い合いに価値がある。**商業施設の人出は、週末と夕方に波がある。公共施設は、平日の昼に安定して人を呼ぶ。子育て中の親が、子育て広場の帰りに食料品を買う。図書館に来た高齢者が、カフェで休む。互いの弱い時間帯を、相手が埋める（第1章）。

ただし、公共施設の来館者が実際にどれだけ買い物をするかを示す公開データは、本書の執筆時点では見つけられていない【要確認】。**集客の効果は、事業計画では上振れの要素として扱う**（17-6）。

## 17-3　公共テナントの制約

公共テナントには、民間テナントとは違う制約がある。参入の前に知っておくべき点を並べる。

| 制約 | 何が起きるか | 備え |
|---|---|---|
| 賃料の水準 | 自治体は相場を超える賃料を払えない。逆に安すぎると「民間への優遇」と批判される | 不動産鑑定などで賃料の根拠を示せるようにする |
| 単年度の予算 | 自治体の予算は年度ごとに議会で決まる。複数年の賃貸借には、議会の議決（債務負担行為など）が要る | 契約の前に、議決の時期と見通しを確かめる |
| 開館時間 | 公共施設の開館時間と休館日は条例などで決まる。商業施設の営業時間と合わないことがある | 入口や動線を分け、時間外の出入りと警備の分担を決める |
| 公共の仕様 | 図書館の床の重さ、バリアフリー、個人情報を扱う窓口の区画など、求められる仕様が商業より厳しいことがある | 内装工事の範囲と費用の分担を、募集の段階で確かめる |
| 政策が変わったときの撤退 | 首長の交代や再編方針の見直しで、計画の凍結や撤退が起こりうる | 中途解約の条件と、原状回復の扱いを契約に書く |
| 公平性 | 特定の民間施設を選ぶ理由を、住民と議会に説明する必要がある | 公募や選定の経緯を記録し、立地を選んだ根拠を示す |
| 企業版ふるさと納税 | 寄附企業に経済的な見返りを与えることは禁止で、違反すると計画の認定取消の対象になる | 寄附する企業と床を貸す（売る）企業が同じなら、価格の根拠と選定の経緯を特に丁寧に示す（第13章） |

政策が変わったときの撤退は、デベロッパーが見落としやすいリスクである。愛知県西尾市では、約198億円・約30年の包括PFIの契約が、市長交代後に凍結され、協議が長期化した。

**公共テナントは、売上の不振では撤退しない。しかし、政策の変化では動く。**その条件を、契約で決めておく。

## 17-4　4つの入り方


| 入り方 | 仕組み | 民間の利点 | 民間の注意点 |
|---|---|---|---|
| ① 賃貸借 | 自治体が商業施設の区画を借り、公共サービスを置く | 床を持ったまま、賃料を得られる。始めるまでが早い | 賃料が毎年の予算に左右される。自治体が移転すると空く |
| ② 今の床を買う（区分所有） | すでにある商業施設の一部の床を、自治体が買って持つ | 売却代金が一度に入る。公共が長く腰を据える | 修繕や建て替えに、自治体との合意が要る。商業部分が衰退しても自治体が抜け出しにくく、話し合いが重くなる |
| ③ 新築で買う（建てる前に約束する） | 着工の前に、自治体が「この広さと仕様の公共部分を、完成したら買う」と約束し、民間がそれに合わせて建てる | 買い手が先に決まるので、建設資金を集めやすい | 着工の前に自治体の予算の議決が要る。議決が遅れると、資金計画が狂う |
| ④ 定期借地 | 自治体が公有地を期限付きで民間に貸し、民間が商業施設を建てる | 土地を買わずに済み、初期投資が軽い | 期限が来たら更地にして返すのが原則。投資を期限内に回収する必要がある |

②と③は、どちらも自治体が床を買う。**違いは、床がいつ、誰の注文でできるかである。**

- **②は、今ある床を買う。**床の広さや形は、商業施設の都合ですでに決まっている。自治体は、空いた区画などを選んで買う。
- **③は、建てる前に「完成したら買う」と約束する。**自治体が公共部分の広さと仕様を先に示し、民間はそれに合わせて設計して建てる。図書館の床の重さや窓口の区画を、最初から設計に入れられる。

③で買った公共部分が商業と同じ建物にあれば、買ったあとは②と同じく区分所有になる。違うのは入口の段階である。

**図17-1　4つの入り方と、お金・床の流れ**

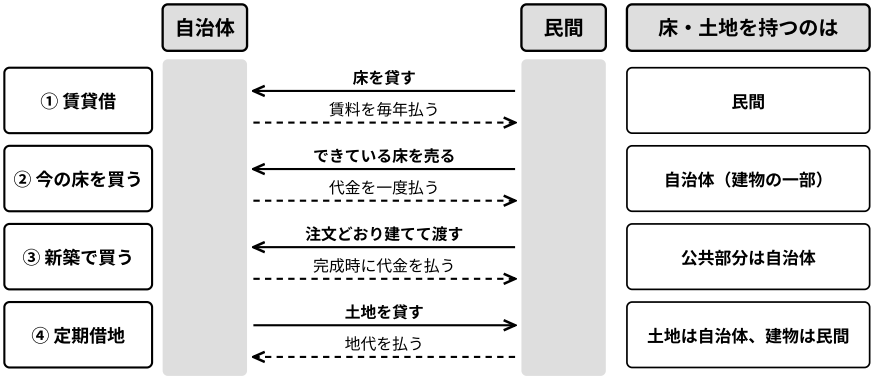


実線は床・土地の動き、点線はお金の動き

③と④は、組み合わせて使える。紫波町のオガールプラザがその例である（17-5）。

## 17-5　事例

### 紫波町 オガールプラザ（岩手県、2012年6月開業）――③と④の組み合わせ

民間の会社が、図書館・地域交流センター・子育て応援センターなどの公共部分と、産直・飲食・医療の民間部分を一体で建てた。工事費約11億円のうち、公共部分の約8億円を町が買い取り、民間部分の約2.7億円は民間が借入れでまかなった。民間部分の土地は32年の事業用定期借地で、地代は年348万円である。地代と税で、年約3千万円が町の収入になっている。

**テナントを先に決め、その賃料から建設費を逆算して資金を調達した**とされる。公共部分が集客の核になり、民間部分は「稼げる規模しか建てない」設計である。

### ホルトホール大分（大分市、2013年7月開館）――公共と民間を事業方式で切り分ける

大分駅南に、市民ホール、市民図書館、社会福祉保健センター、保育所、子育て交流センターなどを集め、約1,500㎡の店舗・事務所も併設した。延床面積は約36,500㎡である。

公共部分は民間が建てて運営し、市が対価を払う。**民間部分は独立採算である。**募集のときには、民間部分を「別棟（土地を借りる）・合築・公共施設内のテナント」のどの形でも提案できるようにしていた（市の募集要項による）。「市が対価を払う部分」と「民間が自ら稼ぐ部分」を分けたことで、それぞれのリスクの持ち方がはっきりしている。

### 旧大宮図書館「Bibli」（さいたま市、2021年12月供用開始）――公共の建物に民間が入る

図書館の移転で空いた建物を、民間事業者が約2.5億円で改修し、飲食などのテナントに転貸している。市には年約900万円の賃料が入る。約10年の賃貸借である。

公共テナントの「逆向き」の例である。民間から見ると、**自治体が手放した建物は、立地のよい床を改修費だけで手に入れる機会**になる。

### 秦野市（神奈川県）――小さな床と敷地から

保健福祉センターに郵便局を誘致し（年200万円の賃料）、庁舎の敷地には独立店舗型のコンビニを定期借地で置いた。大きな再開発でなくても、小さな床や敷地の貸し借りから、公共と民間の組み合わせは始められる。

### 南アルプス市 南アルプスIC周辺整備事業（山梨県、2028年度開業予定）――公募で選ばれた商業施設に子育て・交流の場

市が進める同事業の中央エリア活用の公募で、株式会社IDOMが選ばれ、2026年5月に市と立地協定を結んだ。敷地約3.3haに、リユース商品の店舗と、屋内外のキッズエリア、絵本・児童書をそろえるブックミュージアム、地域の祭りやイベントに使う広場を備えた複合商業施設を計画している（IDOM社の発表による）。公共の関わり方の詳細は公表されていない。

### 反面の例――青森市 アウガ

商業と図書館などの公共施設が一つのビルに入った例である。しかし、商業の売上が計画の半分以下にとどまり、運営する第三セクターが事実上破綻した（第3章）。

**公共テナントがいても、商業の規模が需要を超えていれば、ビルは支えられない。**公共テナントは集客の核になるが、商業の見込み違いを埋め合わせるものではない。

## 17-6　事業計画での見込み方

公共テナントを入れた事業計画では、収入を分けて見込む。

| | 見込み方 | 理由 |
|---|---|---|
| 公共の賃料（または売却代金） | 固定の収入として見込む | 契約で額と期間が決まる。売上の不振では減らない |
| 公共施設による集客の効果 | 上振れの要素として見込み、確実な収入には入れない | 来館者の買い回りを示す公開データが乏しい【要確認】 |
| 政策変更による撤退 | 中途解約の条件を契約で決め、その場合の空き期間を感応度分析に入れる | 首長の交代や再編方針の見直しで起こりうる |

**集客の効果を確実な収入として織り込まない。**これが、アウガと逆の側に立つための条件である。

開業後は、公共施設の来館者数と、同じ時間帯の商業の客数や売上を記録しておく。次の案件の根拠になる。公表できる形で記録を残すことを、自治体と協定で決めておくのも一つの方法である。

## 17-7　規模別の現実解――理想・次善・最低限

デベロッパーの立場から、自治体の規模ごとに狙える形を整理する。

| | 理想 | 次善 | 最低限 |
|---|---|---|---|
| 人口20万人以上 | 駅前の再編で、公共部分を自治体が取得し、民間部分を独立採算で建てる（③、または事業方式での切り分け） | 既存の商業施設に、図書館や子育て支援を賃貸借で入れる（①） | 移転で空く公共の建物を借りて改修し、テナントに転貸する |
| 人口5万〜20万人 | 公有地の定期借地と公共部分の買い取りを組み合わせ、テナントを先に決めて規模を逆算する（③＋④） | 商業施設の空き区画や上の階に、子育て広場や行政窓口を賃貸借で入れる（①） | 商業施設の一角に、出張窓口や相談会を期間を区切って置く |
| 人口5万人未満 | スーパーや道の駅に、支所・図書館の分室・子育て相談をまとめて入れる | 公共施設の空き床や敷地に、郵便局やコンビニを入れる（秦野市型） | 店の前や駐車場で、自治体と共催の市（いち）や催しを開く |

**小さな自治体ほど、商業施設は数少ない「人が集まる場所」である。**大きな開発でなくても、窓口や相談会を置くところから始められる。

## 17-8　自治体から見ると

この章はデベロッパーに向けて書いた。自治体の担当者は、裏返して読んでいただきたい。

**民間は何を気にしているか。**三つある。①賃料と期間が契約でどこまで確かになるか、②政策が変わったときに何が起きるか、③開館時間や仕様の制約がどこまで重いか。**これらを募集の段階で示せる自治体ほど、提案が集まる。**

**どこで失敗するか。**商業施設に入ること自体を目的にすると、その場所に置く理由が薄くなる。第3章の「穴埋め」と同じ形になる。入居は、施設を畳んで移すための手段として計画に位置付ける。

**何を先に決めるか。**四つある。①移す施設と畳む施設、②借りるか買うか、③予算の見通しと議会への諮り方、④撤退のときのルールである。

## 17-9　この章で覚えておくこと

公共テナントの話が来たら、まず**「この施設は、どの施設を畳んで移ってくるのか」**を自治体に聞く。答えが計画に書いてあれば、その入居は長く続く。書いてなければ、政策が変わったときに動く。

そして、事業計画の表では、**公共の賃料と集客の効果を別の行に書く。**
